



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 47	Fecha Informe: 01-02-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha informado a la Entidad su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se han realizado los monitoreos ambientales, los cuales deberán presentar sus respectivos informes.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados, debido a que está por tramitarse el reemplazo de su personal clave.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados por las partidas de obras de arte, de drenaje y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

01-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 60+860
TRAZO Y REPLANTEO PARA MARCO DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE TRAZO Y REPLANTEO PARA EL MARCO DE SALIDA LADO DERECHO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 60+860 CON DOS TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+060
ENCOFRADO PARA MARCO DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE EXCAVACIÓN PARA EL MARCO DE SALIDA LADO DERECHO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+060 CON UN TRABAJADOR Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

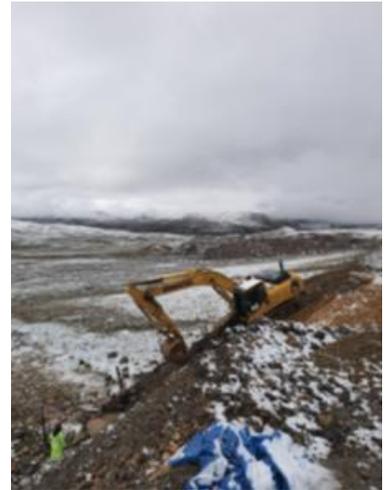

Fecha Toma De Datos:

01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+420
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+420 CON NUEVE TRABAJADORES, UN RESPONSABLE Y NUEVE VIBROPISONADORES.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO PARA EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131 CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, UN VIGIA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377 CON SIETE TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS Y UN VIGIA.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DEL KM 83+700 LD

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON UN EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, UN TRACTOR SOBRE ORUGA Y UN RESPONSABLE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR DE LA PROGRESIVA DEL KM 82+860 LD
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA DEL SECTOR DEL KM 82+860 LD CON UN EQUIPO TIPO TRACK DRILL SOBRE ORUGAS CON SU OPERARIO Y UN TRABAJADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500
TRABAJOS DE PEDRAPLENES

CDescripcion _____:
SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES EN EL SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500 CON UN TRABAJADOR, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LA CANTERA LOCALIZADA EN EL KM 83+700.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 66+300
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 66+300 CON UN AYUDANTE, UN RESPONSABLE, TRES VIGIAS, UNA MOTONIVELADORA Y UN RODILLO CON SU OPERADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021

9
