



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 66	Fecha Informe: 23-02-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados

8) INCIDENTES:

Se efectuó reuniones entre especialistas del Contratista y de la Supervisión de Obra para tratar temas de coordinación en las especialidades de Suelos y Pavimentos.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Se tiene conocimiento de que el área de la Dirección de Obras está solicitando el Estado Situacional de Arqueología de la carretera Canta – Huayllay al área de Derecho de Vía de Provias Nacional.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad.

Auditoria Fecha De Creación:

23-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 CON DOCE TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, DOS VIGIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-02-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DEL KM 37+500 LD

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 37+500 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, UNA ZARANDA MECANICA, UN TRACTOR, UN CARGADOR FRONTAL CON SUS OPERADORES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA EN SU ETAPA DE EXCAVACION ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605 CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, DOS EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS CON SUS OPERADORES.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS ESPECIALIDADES DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

Foto1:

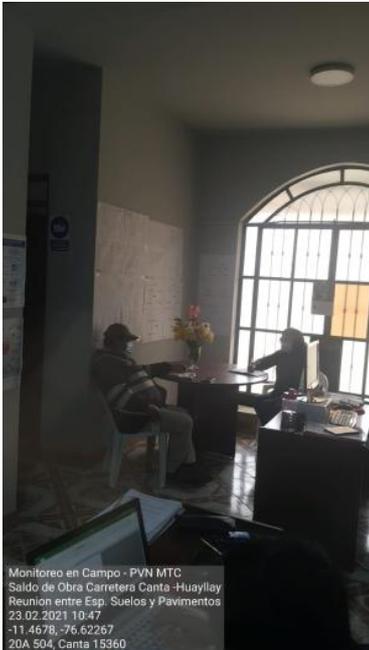


Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021

4
