



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 89
Fecha Informe: 03-04-2021
Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

Asiento n.º 1258, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 2 y 3, Tomo 17)

Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas pendientes de liberación.

Referencia: Asiento n.º 1175

Refiere que, con fecha 18.02.2021, solicito a la Entidad comunicar fecha de autorización para ejecución de trabajos contratados cuya ejecución se encuentra condicionada a la autorización previa del MC, sin embargo, a la fecha no tendrían respuesta. Lo cual, confirma la persistencia de las interferencias Arqueológicas, manteniéndose vigente la causal de ampliación de plazo.

Asiento n.º 1259, Del Contratista, de 23.03.2021 (folios n.ºs 3, 4, 5 y 6 Tomo 17)

Asunto: Paralización de equipos por precipitaciones Pluviales – Inicio de causal de Ampliación de Plazo.

Refiere que el 23 de marzo de 2021, entre el km 144+455 al km 181+000, se presentaron intensas precipitaciones acompañada de granizada, situación que genero la paralización de recursos de diferentes frentes de obra, presentando la relación de equipos, horas maquina y personal paralizadas.

Modificando la ruta crítica del programa de ejecución de obra; una vez culminada la afectación de la ruta crítica, procederán a sustentar la ampliación de plazo.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20, termino vigente al 18 de diciembre de 2020

Ampliación de Plazo Nº 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino vigente al 23 de enero de 2021

Ampliación de Plazo Nº 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino vigente al 16 de febrero de 2021

Ampliación de Plazo Nº 27 por 195 dc, aprobado

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 “Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En proceso de ejecución.

R.D. Nº. Nº0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 02 “Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680” por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. – Ejecución suspendida

R.D. Nº. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 “Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km. 140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km. 141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido IGV., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de ejecución.

4. MAYORES METRADOS:

Nº01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09 km 168+580”

Nº02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km 137+000”

Nº03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 166+000 al km 170+000”

Nº04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”

Nº05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y km 170+000 al 181+000”

Nº06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145

Nº07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”

Complementario Nº01 al MM Nº07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”

Complementario Nº02 al MM Nº07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 173+000”

Nº08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km 137+700”

Nº09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al



km 145+720”

Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 160+120 al km 168+360”

N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km 160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”

N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:

R.D. N°. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. N°. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA

8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización de equipo.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.2.2.MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES

Ninguno

10.PACRI

Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

Se toma conocimiento que, a partir del 30 de marzo de 2021, se suspende temporalmente la ejecución de obra.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

03-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-04-2021

Actividades:
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO EL PROCESAMIENTO DE LOS REGISTROS DE ASISTENCIA DIARIA REALIZADOS A LOS RECURSOS HUMANOS DEL CONSORCIO VIAL AMBO – CONTRATISTA DE OBRA, DE ACUERDO A LA OFERTA REALIZADA.

1

Foto1:

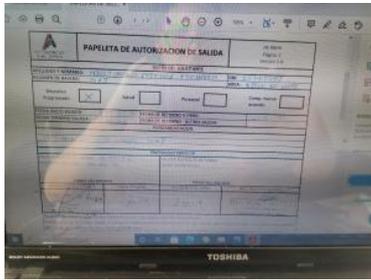


Foto2:


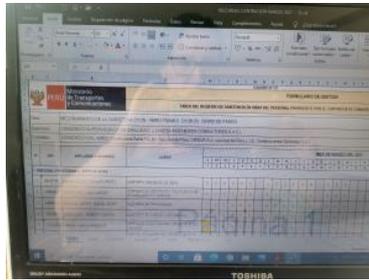


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-04-2021

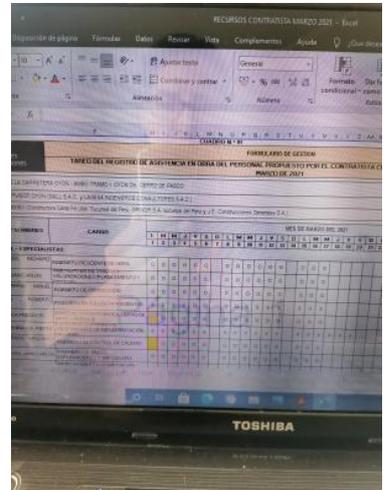

Fotos:
