



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 131
Fecha Informe: 27-05-2021
Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

Asiento n.º 1338, De la Supervisión, de 25.05.2021 (folio n.º 58, Tomo 17)

Asunto: Mayor Metrado en la Partida de Monitoreo Ambiental

Estando próximos al agotamiento de los metrados correspondientes al Monitoreo Ambiental, se remitió al Contratista la propuesta de Mayor Metrado, para, de considerarlo pertinente lo considere en el próximo expediente de Mayor Metrado.

Asiento n.º 1339, De la Supervisión, de 25.05.2021 (folio n.º 58, Tomo 17)

Asunto: Propuesta de Estructura de Contención km 141+014.02 al km 141+025.06

Deja constancia que mediante carta n.º 0526-2021-CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista la evaluación Técnico – Legal, correspondiente a la propuesta de estructura de contención km 141+014.02 al km 141+025.06, que incluía la demolición de cabezal de salida de la alcantarilla km 141+021.50

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Mediante Resoluciones Directorales n.ºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021 respectivamente.

Mediante Adendas n.ºs 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021 al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Traslándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

R.D. N.º 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 01 "Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696", por la suma de S/ 7'264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En Ejecución.

R.D. N.º. N.º0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 02 "Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680" por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% – Ejecutado parcialmente.

R.D. N.º. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 03 "Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km. 140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km. 141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00", por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido I.G.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4. MAYORES METRADOS:

N.º01: "Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09 km 168+580" – Ejecución Suspendida

N.º02: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000" – Ejecución Suspendida

N.º03: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 166+000 al km 170+000" – en Ejecución.

N.º04: "Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal" – Ejecución Suspendida

N.º05: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y km 170+000 al 181+000" – Ejecución Suspendida

N.º06: "Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En ejecución

N.º07: "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" - En ejecución

Complementario N.º01 al MM N.º07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" – En ejecución

Complementario N.º02 al MM N.º07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 173+000" – En ejecución

Complementario N.º 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución

Complementario N° 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la Supervisión de Obra mediante el CdO.

N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km 137+700” – Sin Ejecución

N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al km 145+720” – Ejecución Suspendida

Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución

N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km 160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente

N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:

R.D. N°. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. N°. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos, recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA:

8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple

8.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES

Ninguno

10.PACRI

Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a falta de servicio de movilidad, pese a las coordinaciones realizadas con la Supervisión de obra para los apoyos respectivos ya que estos también tendrían restricciones con la dotación de combustible a sus unidades vehiculares.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:

Movimiento de tierras: km 158+560 al km 161+020, 164+900 al km 166+970, km 171+800 al km 172+360



Sub base granular y base de concreto: km 158+400 al km 161+020

Pavimento de Concreto Hidráulico: km 158+690 al km 159+100

Obras de arte:

Construcción de Muros de Contención (Contractual y PAO N° 01):

km 143+428 al km 143+478, km 144+870 al km 144+890, km 147+628 al km 147+752, km 151+409 al km 151+453, km 165+190 al km 165+216, km 165+920 al km 165+930, km 166+974 al km 166+995, km 166+974 al km 166+995, km 167+140 al km 167+870 y km 167+735 al km 167+790

Alcantarilla tipo TMC: km 154+590

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19, por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Del panel fotográfico n°. 1 (cuarto día consecutivo que algunas unidades vehiculares se encontrarían inoperativas, aparentemente por falta de dotación de combustible), se sugiere exhortar al Consorcio Supervisor Oyón la dotación de combustible a sus unidades vehiculares con la finalidad del transporte de su personal y el cumplimiento de las actividades contratadas al CSO evitando riesgos en la calidad de la obra en el marco del Contrato n°. 007-2018-MTC/20, y de ser el caso posibles contagios por Covid -19 por exceso de aforos en las unidades vehiculares, en las que su personal se estaría transportando.

Auditoria Fecha De Creación:

27-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA Motta

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

27-05-2021

Actividades:

Inoperatividad de Algunas Unidades vehiculares del CSO
Progresiva: km 0+000 – Exteriores de la Oficina del CSO

CDescripcion_____:

Los conductores de las unidades vehiculares de placas AXV-884, D9C-814 y AXE-903, por CUARTO DÍA CONSECUTIVO, manifestaron su preocupación por la falta de dotación de combustible a sus unidades vehiculares, motivo por el cual no habrían salido a campo el día de hoy, por lo cual estarían inoperativas.

Parte del personal del CSO estarían transportándose en unidades vehiculares del CVA, sin embargo, el aforo en dichos vehículos estaría por encima de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud a fin de evitar el aglomeramiento de personas y por tanto posibles contagios por Covid-19, poniendo en riesgo su salud.

Hechos que podrían poner en riesgo la Calidad de la Obra, de ser el caso incumplimiento del Contrato Suscrito y posibles contagios por Covid-19.

Es preciso indicar que en la medida de lo posible se vienen registrando los kilometrajes recorridos de dichas unidades vehiculares a fin de corroborar su desplazamiento en el ámbito de la obra

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-05-2021

Actividades:
 Actividades de Gabinete
 Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_____:

De la remisión de las Resoluciones Directoral N°s. 2676-2020-MTC/20, 097-2021-MTC/20 y 0604-2021-MTC/20 de 9 de diciembre de 2020, 12 de febrero de 2021 y 12 de abril de 2021; en el que aprueba la Prestación Adicional de Supervisión N°s 1, 2 y 3 trasladándose la fecha de término de la ejecución de supervisión de obra del 18 de diciembre de 2020 al 23 de enero de 2021, al 16 de febrero de 2021 y al 30 de agosto de 2021 respectivamente, se realiza la actualización de los recursos verificados del Consorcio Supervisor Oyón incluso desde el martes 25 de los corrientes.

2 Los cuales son remitidos vía correo electrónico al Administrador de Contrato.

Foto1:

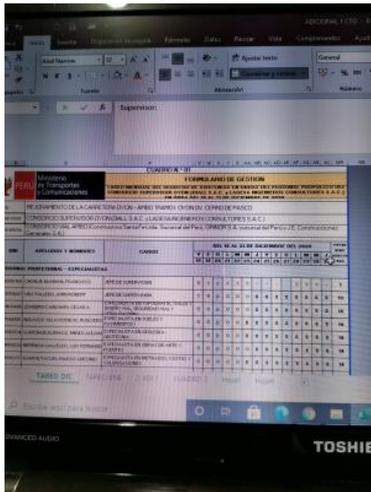


Foto2:


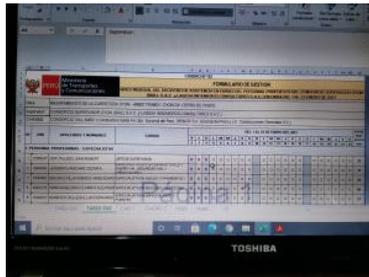


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-05-2021

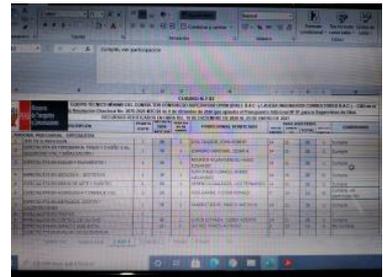

Fotos:
