

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: N o Aplic a	Nro Informe: 016	Fecha Informe: 12-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)		Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: NUMERO DE INFORME : 00016 CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018 EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)
 Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)
 Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.
 Deductivo Vinculante N° 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)
 Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.
 Deductivo Vinculante N° 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)
 Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)
 Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.
 Deductivo Vinculante N° 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)
 Plazo de Ejecución Total 10 años
 Plazo de Ejecución OI-2 22 meses
 Inicio de Obra 20 de noviembre 2019
 Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020
 Reinicio de Obra 03 de agosto 2020
 Fin de Obra 09 de setiembre 2021
 Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.
 Fin de Obra Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021
 Prórroga de Plazo N° 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días calendario.
 Fin de Obra Prorroga N° 02 30 de noviembre 2021
 Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 03 05 de diciembre 2021
 Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 04 05 de diciembre 2021
 Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 05 05 de diciembre 2021
 Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 06 10 de Febrero 2022
 Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 07 10 de Febrero 2022
 Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 08 11 de Abril 2022
 Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 09 13 de Abril 2022
 Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022
 Fin de Obra hasta Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

Recomendaciones:

Ya se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819
 Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.

Auditoria Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

construcción de Puente San Juan

CDescripcion :

1 Colapso de acceso km 70+146 al promediar las 01:00 hrs 12.02.2022

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Construcción de Puente San Juan

CDescripcion :

2 Colapso de acceso prog. 70+165

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De**Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

construcción de Puente San Juan

CDescripcion :

3 Colapso de acceso km 70+165 al promediar las 01:00 hrs 12.02.2022

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De**Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Construcción de Alc. MCA

CDescripcion :

4 Nivelación para solado Alc. prog. 72+220

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro de Contención

CDescripcion :

5 Control de niveles para vaciado de Zapata prog. 73+538

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Contrucción de Muro de Contención

CDescripcion :

6 Desencofrado y Encofrado de Muro prog. 71+486

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Limpieza de material saturado

CDescripcion :

7 limpieza de material inadecuado prog. 73+600

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**



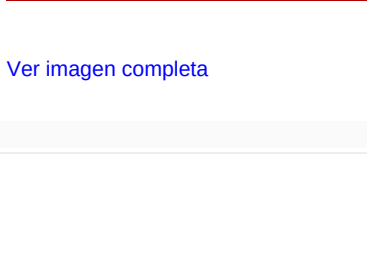
12-02-2022

Actividades:

Limpieza de material saturado

CDescripcion :

8 limpieza de material inadecuado prog. 73+600

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Limpieza de material saturado

CDescripcion :

limpieza de material inadecuado prog. 73+600

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Limpieza de material saturado

CDescripcion :

limpieza de material inadecuado prog. 73+600

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla MCA

CDescripcion :

Encofrado de Muros y loza de piso prog. 101+940

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

12-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla MCA

CDescripcion :

habilitación de acero y Encofrado Alc. 101+940

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

16-02-2022

Actividades:**CDescripcion** :**Foto1:****Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

16-02-2022

Actividades:

Construcción de Puente Estacamachay

CDescripcion :

Desencofrado y limpieza prog. 95+513

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

16-02-2022

Actividades:

construcción de Alcantarilla MCA

CDescripcion :

Habilitación de acero losa de techo prog. 101+940

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla MCA

CDescripcion :

Encofrado de aleros aguas arriba lado izq. y der. prog. 101+940

Foto1:**Foto2:****Foto3:**[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)
