

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe:     | Fecha Informe:   | Nombre De La Obra:                                                                                                                                               | Personal Encargado:           |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| No                 | 079              | 24 - 05 - 2022   | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2) | AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |                  |
| Foto Bitacora:     | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4:                                                                                                                                                 | Foto Bitacora 5:              | Foto Bitacora 6: |

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00079  
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018  
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation  
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****SUPERVISOR DE OBRA**

Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2

Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.

Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendario

Etapa de Supervisión OI-2 22 meses

Etapa de Aceptación y Liquidación 2 meses

Inicio de Servicios Supervisión OI.2 20 de noviembre 2019

Fin de Servicio Supervisión OI.2 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 02 05 de diciembre 2021

Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 03 10 de febrero 2022

Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 04 11 de abril 2022

**CONTRATISTA DE OBRA**

Empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION

Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20

Presupuesto Total S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-2 S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.

Adelanto Directo S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.

Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)

Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)

Plazo de Ejecución Total 10 años

Plazo de Ejecución OI-2 22 meses

Inicio de Obra 20 de noviembre 2019

Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020

Reinicio de Obra 03 de agosto 2020

Fin de Obra 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prórroga de Plazo N° 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 02 30 de noviembre 2021

Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 0305 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 04 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 05 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 06 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 07 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 08 11 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario



Fin de Obra Prorroga N° 09 13 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

Fin de Obra hasta Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

### Recomendaciones:

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva

km. 52+920 al Km. 102+819,

Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.

Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,

Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta cometiendo en obra.

### Auditoria Fecha De Creación:

26-05-2022

### Auditoria Fecha De Edición:

26-05-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

##### Nivel:

No Aplica

##### Fecha De Fotografía:

24-05-2022

##### Actividades:

Construcción de Peaje

1

##### CDescripcion

:

prog. 94+800

##### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

##### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

##### Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

Construcción de Peaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De  
Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

Voladura

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De  
Fotografia:**

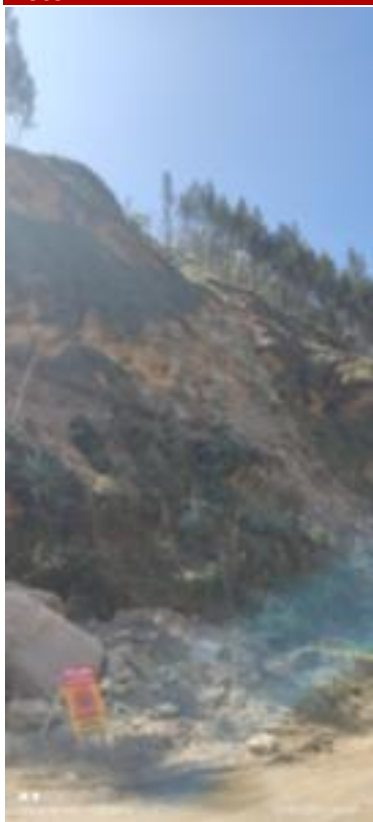
24-05-2022

**Actividades:**

Trabajos de Voladura

**CDescripcion** :

prog. 94+680

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
