

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
No Aplica	126	16 - 07 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00126
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****CONTRATISTA DE OBRA**

Empresa: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION

Contrato de Obra: N° 127-2018-MTC/20, suscrito el 05.nov.2018

Sistema de Contratación: A Precios Unitarios

Presupuesto Total: S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-2: S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.

Adelanto Directo: S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.

Entrega Adelanto Directo: noviembre 2019

Evento Compensable N° 01: S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N° 1152-2020-MTC/20 - 07.08.2020)

Evento Compensable N° 02: S/ 00.00 (RD N° 1626-2020-MTC/20 - 22.09.2020) – Evento Compensable N° 02.

Prestación Adicional N° 01: S/ 3 991 018,25 (RD N° 0379-2021-MTC/20 - 15.03.2021)

Deductivo Vinculante N° 01: S/ 1 557 391,05 (RD N° 0379-2021-MTC/20 - 15.03.2021)

Prestación Adicional N° 02: S/ 3 970 975,51 (RD N° 1267-2021-MTC/20 - 02.07.2021)

Deductivo Vinculante N° 02: S/ 148 249,39 (RD N° 1267-2021-MTC/20 - 02.07.2021)

Plazo de Ejecución Total: 10 años

Plazo de Ejecución OI-2: 22 meses

Inicio de Obra: 20 de noviembre 2019

Termino Contractual Inicial: 09 de setiembre 2021

Prórroga de plazo N° 01: Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20 - 08.07.2020); 82 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 01: 30 de noviembre 2021

Prórroga de plazo N° 02: Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20 - 08.09.2020); 00 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 02: 30 de noviembre 2021

Prórroga de plazo N° 03: Procedente en Parte (RD N° 1512-2020-MTC/20 - 11.09.2020); 05 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 03: 05 de diciembre 2021

Prórroga de plazo N° 04: Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20 - 22.01.2021); 00 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 04: 05 de diciembre 2021

Prórroga de plazo N° 05: Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20 - 08.02.2021); 00 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 05: 05 de diciembre 2021

Prórroga de plazo N° 06: Procedente en Parte (RD N° 0685-2021-MTC/20 - 20.04.2021); 67 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 06: 10 de febrero 2022

Prórroga de plazo N° 07: Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20 - 13.07.2021); 00 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 07: 10 de febrero 2022

Prórroga de plazo N° 08: Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20 - 06.08.2021); 60 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 08: 11 de abril 2022

Prórroga de plazo N° 09: Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20 - 29.10.2021); 02 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 09: 13 de abril 2022

Prórroga de plazo N° 10: Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20 - 10.12.2021); 28 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 10: 11 de mayo 2022

Prórroga de plazo N° 11: Improcedente (RD N° 616-2022-MTC/20 - 11.05.2022); 00 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 11: 11 de mayo 2022

Prórroga de plazo N° 12: Procedente en parte (RD N° 667-2022-MTC/20 - 18.06.2022); 09 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 12: 20 de mayo 2022

Prórroga de plazo N° 13: Procedente en parte (RD N° 790-2022-MTC/20 - 08.06.2022); 82 días calendario.

Fin Prórroga de plazo N° 13: 10 de agosto 2022

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Recomendaciones:**

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva

km. 52+920 al Km. 102+819,

Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.

Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,

Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta cometiendo en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

20-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

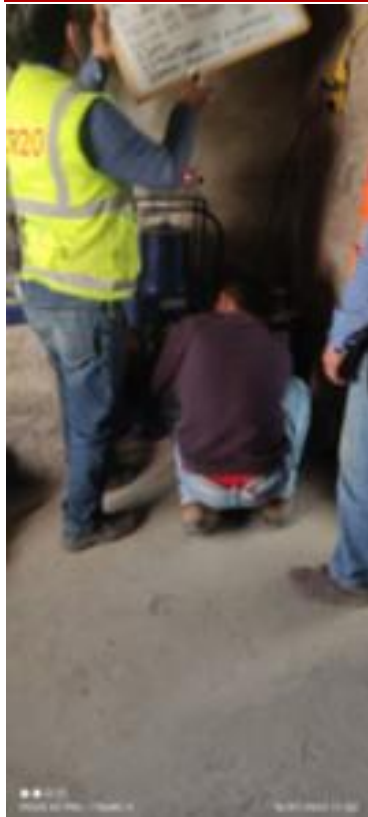
16-07-2022

Actividades:

LABORATORIO HOB PEAJE

CDescripcion :

Rotura de testigo de concreto

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2022

Actividades:**CDescripcion** :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2022

Actividades:**CDescripcion :****Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2022

Actividades:

rotura de testigo de concreto prog. 94+383

CDescripcion :

laboratorio HOB PEAJE

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2022

Actividades:

6

CDescripcion :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)
