



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 66 - 2019	Fecha Informe: 15-04-2019	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:



Asunto:

Actividades del día 15-04-2019

Conclusiones:

- Continúan los trabajos de topografía y georeferenciación por el contratista (16+500 y 47+600) y verificaciones por la supervisión (36+500 y 37+000)
- En campamento del km. 37+720, continúan los trabajos de instalación de cobertura liviana (se ha avanzado el 50%) y también instalación de puertas metálicas como estructura metálica para techo, correspondiente a los ambientes del campamento
- Continúan los trabajos de movimiento de tierras, mediante excavación de material suelto en km. 46+500 y 47+000 con dos excavadoras hidráulicas y carguío de excedentes a volquetes para su traslado al DME-C 52+730
- En DME-C del km. 52+730 se continúa con los trabajos de conformación de excedentes con tractor sobre orugas, habiéndose obtenido ya una amplia plataforma de descarga.
- Continúa también los trabajos de acondicionamiento de nuevos Depósitos de Material Excedente, mediante retiro y acumulación de capa top soil con excavadora hidráulica en DME-B 52+730. En DME_51C del km. 51+000 se encuentran paralizados los trabajos por reclamos de algunos pobladores, sin embargo ya se ha avanzado con la conformación del acceso y retiro de capa top soil.
- Se realiza mantenimiento vial, mediante perfilado de superficie con motoniveladora en acceso a DME-C km. 52+730.

Recomendaciones:

Continuar con los trabajos de movimiento de tierras y con las actividades preparatorias para iniciar el corte de roca.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-04-2019

Actividades:
 topografía y Georeferenciacion

CDescripcion_____:
 supervisión verifica levantamiento topográfico en km. 36+500

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-04-2019

Actividades:
 topografía y Georeferenciacion

CDescripcion_____:
 supervisión realiza verificación de levantamiento topográfico en km 37+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 disposición y conformación de DME-Cen km. 52+730

CDescripcion_____:
 descarga de volquetes y conformación de excedentes con tractor sobre orugas CAT

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 disposición y conformación de DME-B km.52+730

CDescripcion_____:
 retiro y acumulación de capa top soil con excavadora hidráulica CAT
 Se observa también transporte de excedentes con volquete y perfilado con motoniveladora.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
disposición y conformación de DME-51C en km. 51+000

CDescripcion_____:
Maquinaria paralizada (tractor sobre orugas komatsu), debido a reclamos de pobladores de la zona. El contratista viene resolviendo los reclamos con su especialista en relaciones comunitarias
Se observa que se ha avanzado con la conformación del acceso y retiro + acumulación de capa top soil

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUÍNIÑO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2019

Actividades:

topografía y Georeferenciacion

CDescripcion_____:

levantamiento topográfico por el contratista en km. 47+600

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
movimiento de tierras

CDescripcion_____:
excavación de material suelto y carguío de excedentes con excavadora hidráulica en km. 46+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUIÑIGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2019

Actividades:

topografía y Georeferenciacion

CDescripcion_____:

contratista realiza levantamiento topográfico en km. 16+500

Foto1:



Foto2:

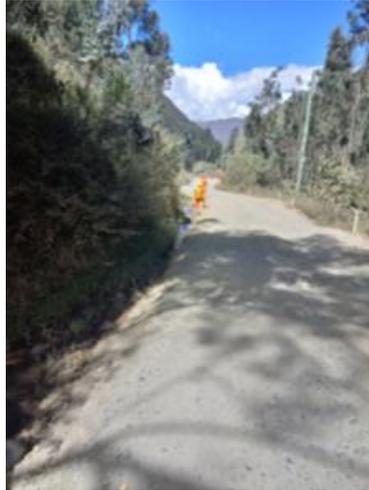


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-04-2019

Actividades:
acondicionamiento de campamento y patio de máquinas en km. 37+720

CDescripcion_____:
instalación de puertas metálicas y estructuras metálicas de soporte de techo. se ha avanzado el 50% de la instalación de cobertura liviana

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-04-2019

Actividades:
movimiento de tierras

CDescripcion_____:
excavación de material suelto en km. 47+000 y carguio a volquetes con excavadora hidráulica
se observa otra excavadora hidráulica estacionada, esperando mantenimiento mecánico.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019
