



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 165	Fecha Informe: 05-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

EN LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, CAPAS ANTICONTAMINANTES Y RELLENO ESTRUCTURAL DE LAS ALCANTARILLAS SE ESTA UTILIZANDO EL DENSÍMETRO NUCLEAR, SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR Y/O OPERADORES DE ESTE EQUIPO UTILICE LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS POR SU SEGURIDAD.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO DEBE TENER MAYOR COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS A ABASTECER CONSIDERANDO LAS DISTANCIAS Y ADITIVOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO PARA EVITAR PERDIDAS DE TIEMPO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 46+929 encofrado metálico de panel de estribo derecho y mantenimiento de generador eléctrico.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Baden n° 03

CDescripcion_____:
Ubicación de badén en la progresiva 43+709 de 20m x 8.40m relleno y compactado.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Dme n° 11

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva 42+300, eliminación de material proveniente de corte

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00)

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 40+050, perforacion de pilotes del pilar central izquierdo

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Planta de asfalto

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 39+000 instalación y acondicionamiento de ambientes

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Planta de asfalto

CDescripcion_____:
Instalación de maquinaria y equipos

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:

Ubicación en la progresiva km 38+360, verificación de diseño de mezcla y proceso de producción.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

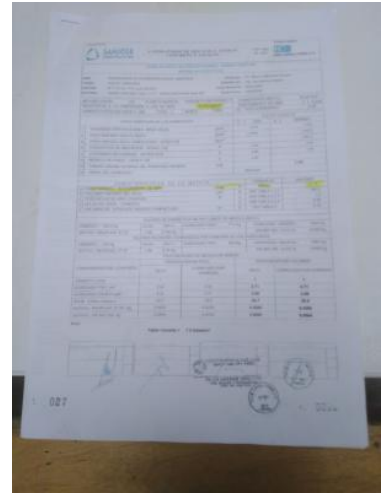

Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Planta chancadora

CDescripcion_____:

En proceso de producción

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Chancadora n 02

CDescripcion_____:

En mantenimiento

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Riego y compactado de material para relleno ubicado en la progresiva km 36+960

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Extendido y compactado de material para corona Segunda capa ubicado en la progresiva km 36+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Defensa ribereña

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva 35+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Defensa ribereña

CDescripcion_____:
 Enrocado con excavadora hidráulica sobre orugas ubicado en la progresiva 35+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Puente Ilinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:

Preparativos para la instalación de falso puente ubicado en la progresiva km 33+760

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019
