



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N 0 058 - 2023 - MTC/ 20.9/ MJQY	25 - 04 - 2023	Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo II	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa					

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", INICIO KM 94+383 AL FINAL KM 94+912.

(HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA): COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OC PEAJE: S/ 3,466,615.32 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL: S/ 1,241,495,685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA OC PEAJE: S/ 18,080,525.36 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OC PEAJE: S/ 18,080,525.36 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 24.NOV.2021

FECHA DE INICIO DE OBRA: 25.NOV.2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 270 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 21/AGO/2022

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE: 24/SET/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA VIGENTE: 304 DIAS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA)

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

(HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N°:

NO HAY REGISTROS DE FOTOGRAFIA DEL CUADERNO DE OBRA (C.O.) LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, NO HAN PROPORCIONADO EL C.O. AL SUSCRITO (MONITOR DE OBRA TRAMO 2).

2. PRORROGA AMPLIACIÓN DE PLAZO - (AMPLIACIONES DE PLAZO)

PRORROGA PLAZO N° 01, IMPROCEDENTE CON R.D. N° 321-2022-MTC/20, DEL 25 MARZO 2022.

PRORROGA PLAZO N° 02 IMPROCEDENTE CON R.D. N° 998-2022-MTC/20, DEL 14 JULIO 2022.

PRORROGA PLAZO N° 03 APROBADA CON R.D. N° 1268-2022-MTC/20, DEL 07 SETIEMBRE 2022: 16 DÍAS CALENDARIO.

PRORROGA PLAZO N° 04 IMPROCEDENTE CON R.D. N° 1298-2022-MTC/20, DEL 09 SETIEMBRE 2022.

PRORROGA PLAZO N° 05 APROBADA CON R.D. N° 1355-2022-MTC/20: 15 DÍAS CALENDARIO.

PRORROGA PLAZO N° 06 IMPROCEDENTE CON R.D. N° 1668-2022-MTC/20, DEL 21 NOVIEMBRE 2022.

PRORROGA PLAZO N° 07 IMPROCEDENTE CON R.D. N° 017-2023-MTC/20, DEL 06 ENERO 2022.

PRORROGA PLAZO N° 08 CONTRATISTA PRESENTA CON CITE: CR20-GC-SP-2023/095. LA SUPERVISIÓN ENVÍA A LA ENTIDAD CON CARTA N° 2510020-OC.2-CJS-23-056 DEL 07 FEBRERO 2023. SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECLARAR IMPROCEDENTE.

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N° 01, CONTRATISTA PRESENTA CON CITE: CR20-GC-SP-2023/020. LA SUPERVISIÓN ENVÍA A LA ENTIDAD CON CARTA N° 2510020-OC.2-CJS-23-039 DEL 28 ENERO 2023. SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECLARAR IMPROCEDENTE.

4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) – VARIACIONES (PRESTACIÓN ADICIONALES DE OBRA)

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 01, CONTRATISTA PRESENTA CON CITE: CR20-GC-SP-2023/095. LA SUPERVISIÓN ENVÍA A LA ENTIDAD CON CARTA N° 2510020-OC.2-CJS-23-056 DEL 07 FEBRERO 2023.

5. MAYORES CANTIDADES - (MAYORES METRADOS)

EL COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912 NO TIENE MAYORES CANTIDADES

6. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE

EL COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912 NO TIENE DEDUCTIVOS VINCULANTES

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

ELABORACIÓN INFORMES QUINCENALES Y MENSUALES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VÍA: DEL KM 94+383 AL KM 94+912

MANTENIMIENTO DE LA VÍA: KM 94+383 AL KM 94+912

9. EMPRESA CONTRATISTA CR20:

05 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

10. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

02 UNIDADES DE LAS 35 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

11. CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

02 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

12. VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

01 CAMIONETA, TOTAL 01 UNIDAD EN OBRA

13. ARQUITECTURA

ASENTADO DEL MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EL CONTRATISTA HA EJECUTADO ESTA PARTIDA EN BLOQUE HOSPEDAJE SECTOR B.

TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

EL CONTRATISTA HA EJECUTADO ESTA PARTIDA EN BLOQUE HOSPEDAJE SECTOR A, MURO INTERIOR Y EXTERIOR

14. ESTRUCTURAS

CONSTRUCCIÓN DEL PEAJE, RAMPA Y PUENTE PEATONAL

CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA ALIGERADA H=0.17m

COLOCACIÓN DE LADRILLO PARA TECHO H=0.12m

CONSTRUCCIÓN DE LA BARANDA METALICA

EL CONTRATISTA HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LAS BARANDAS METÁLICAS DE PUENTE PEATONAL.

TRABAJOS EN LA CUNETA BERMA REVESTIDA EN CONCRETO TIPO C2

EL CONTRATISTA A EJECUTADO EL VACIADO DE LA TAPA DE CUNETA TIPO C2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+700 AL KM 94+740

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE BIODIGESTOR N° 02

TRABAJOS DE TARRAJEO DE MUROS SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

TRABAJOS DE SELLADO DE BASE IMPRIMANTE EN EL BLOQUE 3 – COMERCIO

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA ENCOFRADO DE ISLA EN EL MÓDULO 1 BLOQUE 10 - CASETA DE COBRO

TRABAJOS DE SELLADO DE BASE IMPRIMANTE EN EL BLOQUE 8 - CASETA POLICIAL

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN LOS SS. HH. EN EL BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

TRABAJOS DE VACIADO DE FALSO PISO SECTOR A EN EL BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

ENSAYO DE RUGOSIDAD EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LOS CARRILES DERECHO E IZQUIERDO KM. 94+730 AL KM. 94+911.76



Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

SE COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL COMPONENTE DE PEAJE PARA COMUNICAR Y RECOMENDAR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBERÁ INCREMENTAR SUS RECURSOS DEBIDO A QUE EL AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA AL 31 DE MARZO 2023, ES DE 45.482%, SEGÚN LA FICHA QUINCENAL.

SE COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL COMPONENTE DE PEAJE PARA COMUNICAR Y RECOMENDAR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, INCREMENTAR SUS RECURSOS EN ACTIVIDADES DE ACABADOS Y TRABAJAR EN FORMA PARALELA EN LOS DEMÁS BLOQUES.

SE COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL COMPONENTE DE PEAJE PARA COMUNICAR Y RECOMENDAR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, ELIMINAR EL MATERIAL DE DERRUMBE EN EL KM. 94+650, ENTRE LOS BLOQUES 01 Y 02, SECTOR TERRAZA.

SE COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL COMPONENTE DE PEAJE PARA COMUNICAR Y RECOMENDAR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBERÁ DE RENOVAR E IMPLEMENTAR LOS EPP A TODOS SUS TRABAJADORES.

SE COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL COMPONENTE DE PEAJE PARA COMUNICAR Y RECOMENDAR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBERÁ DE HACER LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE COTIDIANAMENTE PARA EL USO Y CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.

CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PEAJE DE LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECCIÓN VII CUENTA EN OBRA CON 01 RESIDENTE DE OBRA Y 05 ESPECIALISTAS, ASÍ MISMO 09 ESPECIALISTAS SON COMPARTIDOS CON EL TRAMO 2; A LA FECHA ESTÁN APROBADOS EL RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE OFICINA DE INGENIERÍA, RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA E INGENIERO ELECTROMECAÁNICO.

CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PEAJE DE LA ENTIDAD, SI BIEN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA HA CONCLUIDO, EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, LABOR QUE AL ESTAR DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE NUESTRO CONSORCIO LA "SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA OC PEAJE" CONTINÚAN SIENDO SUPERVISADAS POR EL CONSORCIO. RESPECTO A LO ANTERIOR SE HA SOLICITADO A LA ENTIDAD MEDIANTE LAS CARTAS N° 2510020-OC.2-22-026 Y 2510020-OC.2-22-029 DEL 22.JUL.22 Y 09.AGO.22 RESPECTIVAMENTE INSTRUCCIONES PARA LA CONTINUIDAD DE NUESTRO SERVICIO.

CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PEAJE DE LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN EL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N°01. MEDIANTE CARTA N°2510020-OC.2-CJS-23-039 DE FECHA 28.01.2023, LA SUPERVISIÓN REMITE A LA ENTIDAD EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N°01: "SOLUCIONES GEOTÉCNICAS Y DE DRENAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+650 AL KM 94+820", PARA SU TRÁMITE DE APROBACIÓN RESPECTIVA.

CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, CON RESPECTO AL OFICIO N° 819-2023-MTC/20.9 DEL PASADO DÍA 14.04.2023 Y EL MEMORÁNDUM DE LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA N° 3220-2023-MTC/20.11, INFORMO AL RESPECTO SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS AFECTADOS CON RELACIÓN A LOS LÍMITES DE ALCANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO CHICO DEL LADO DERECHO (TRAMO 2), HASTA EL INGRESO A QUIVILLA EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CUYA DESCARGA INTERFIERE CON UNA VIVIENDA, ASÍ MISMO, EN CUANTO A LA INTERFERENCIA DE UN POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LE CORRESPONDE AL TRAMO 3 EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTRIBO LADO IZQUIERDO EN EL SENTIDO DE RIO AGUAS ABAJO; SIENDO LATENTES DICHAS INTERFERENCIAS QUE A LA FECHA, AUN NO SE HAN REUBICADO.

RECOMIENDO A LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA QUE DESIGNE A UN PROFESIONAL Y ACOMPAÑE LAS ACCIONES A REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL PACRI DE LA SUPERVISIÓN Y EL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 DEL TRAMO 3

Auditoria Fecha De Creación:

26-04-2023

Auditoria Fecha De Edición:

26-04-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO – CONO DE ARENA

MEJORAMIENTO DEL SUELO A NIVEL DE SUB RASANTE

ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO DEL SUELO CON EL MÉTODO DE CONO Y ARENA

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

EL ENSAYO PERMITE CALCULAR IN SITU EL VALOR DE LA DENSIDAD NATURAL DE LOS SUELOS, ESPECIALMENTE EN SUELOS SIN COHESIÓN, ARENAS Y GRAVAS

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

1


MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 CONO DE ARENA METÁLICO, 01 FRASCO CON ARENA, 01 SACO DE ARENA, 01 BALANZA ELECTRÓNICA, 01 ESPÁTULA, 01 COMBA, 01 MARTILLO, 01 ESTACA DE FIERRO, 02 BROCHA 4", 01 ZARANDA METÁLICA Y HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

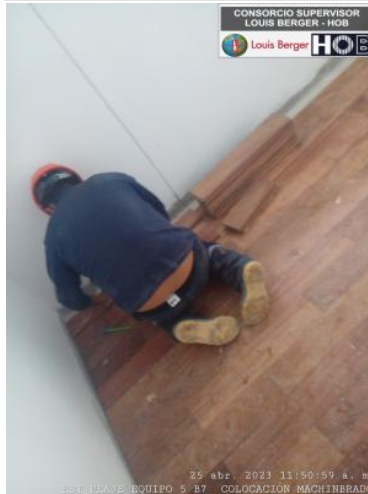

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TEJA ANDINA SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE TARTAJEÓ EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR A

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

ASENTADO DE LADRILLOS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

EMPASTADO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL ÁREA DE COMERCIO

2

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL TECHO ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL TECHO ALIGERANDO FC210 KG/CM2 DEL ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRE CIMIENTO EN EL ÁREA DE CONTINUACIÓN DEL BLOQUE 5 - SERVICIOS CONEXOS

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 06 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 12 PEONES, 02 CONTROLADORES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01 VOLQUETE DE 15 M3, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TEJA ANDINA SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE TARTAJEÓ EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR A

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

ASENTADO DE LADRILLOS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

EMPASTADO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL ÁREA DE COMERCIO

3

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL TECHO ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL TECHO ALIGERANDO FC210 KG/CM2 DEL ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRE CIMIENTO EN EL ÁREA DE CONTINUACIÓN DEL BLOQUE 5 - SERVICIOS CONEXOS

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 06 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 12 PEONES, 02 CONTROLADORES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01 VOLQUETE DE 15 M3, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TEJA ANDINA SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE TARTAJEÓ EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR A

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

ASENTADO DE LADRILLOS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

EMPASTADO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL ÁREA DE COMERCIO

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL TECHO ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL TECHO ALIGERANDO FC210 KG/CM2 DEL ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRE CIMENTO EN EL ÁREA DE CONTINUACIÓN DEL BLOQUE 5 - SERVICIOS CONEXOS

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 06 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 12 PEONES, 02 CONTROLADORES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01 VOLQUETE DE 15 M3, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

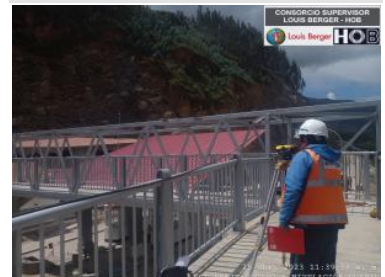

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TEJA ANDINA SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE TARTAJEÓ EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR A

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

ASENTADO DE LADRILLOS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

EMPASTADO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL ÁREA DE COMERCIO

5

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL TECHO ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL TECHO ALIGERANDO FC210 KG/CM2 DEL ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRE CIMIENTO EN EL ÁREA DE CONTINUACIÓN DEL BLOQUE 5 - SERVICIOS CONEXOS

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 06 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 12 PEONES, 02 CONTROLADORES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01 VOLQUETE DE 15 M3, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TEJA ANDINA SECTOR B BLOQUE 2 – HOSPEDAJE

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 CM. MORTERO 1:1:5 (E=0.15M)

ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE TARTAJEÓ EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL BLOQUE 2-HOSPEDAJE SECTOR A

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

TRABAJOS DE TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1,5 CM

ASENTADO DE LADRILLOS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CONTINUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS CONEXOS LADO DERECHO

EMPASTADO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL ÁREA DE COMERCIO

6

MUROS, SELLADOR Y PINTURA LATEX LAVABLE INTERIORES, DOS CAPAS

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL TECHO ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL TECHO ALIGERANDO FC210 KG/CM2 DEL ÁREA DE HOSPEDAJE SECTOR B

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRE CIMIENTO EN EL ÁREA DE CONTINUACIÓN DEL BLOQUE 5 - SERVICIOS CONEXOS

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 06 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 12 PEONES, 02 CONTROLADORES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01 VOLQUETE DE 15 M3, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-04-2023



Fotos:
