



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 0091	Fecha Informe: 20 - 05 - 2023	Nombre De La Obra: Corredor Vial: Huánuco - La Unión- Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0091-2023
 CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
 OBRA: "CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL; HUANUCO- LA UNION- HUALLANCA –DV. ANTAMINA – EMP.PE 3N" (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA- ANTAMINA - TRAMO 1 LONGITUD: 52.92 KMS.
 MONTO DEL CONTRATO : S/ 1,241,495,685.46 INCLUYE IGV
 MONTO DEL CONTRATO TRAMO 1 (OI-1) ; S/ 323,942,616.32 Nuevo Monto del Presupuesto OI-1 S/ 395 427 697,64 Inc. I.G.V con precios a junio 2018
 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 144 -2018-MTC/20.2
 MONTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: S/. 123,625,905,13 INCLUYE IGV
 MONTO ASIGNADO AL PRIMER TRAMO (PRIMER EQUIPO) : S/ 27,450,314.74 INCLUYE IGV
 LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION
 - VISITA DE VERIFICACION DE NO EJECUCION DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA VARIACION No. 25



Conclusiones:

- 0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Supervisión, Hoy se busco el cuaderno de obra en el campamento y no se logro acceso al mismo, puesto que el cuaderno fue llevado a las oficinas de la supervisión.
- 1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Mediante Resoluciones Directorales N° 090,829, 1491, 2532-2020- MTC/20, 0060, 1304, 1606, 2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20; 430, 623, 631, 1095, 1288, 1418, 1439, 1637y1801-2022-MTC/20 y 022-2023-MTC/20 de fecha 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021,7.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, .11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022, 11.05.2022,12.05.2022, 27.07.2022, 09.09.2022, 30.09.2022, 06.10.2022, 10.11.2022, 07.12.2022 y 10.01.2023, se declara procedente la prórroga del Plazo de ejecución de obra N° 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01,143,12, 02, 01, 147, 01, 01, 77, 01, 11 , 01, 40,25,25 y 1 días Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 09-07-2023
- 2) ADICIONALES DE OBRAS (VARIACIONES) : Prestación Adicional de Obra N° 01, S/ 10790416,90 inc. I.G.V.; prestación Adicional de Obra N° 02, S/ 447 228,01 inc. I.G.V.; Prestación Adicional de Obra N° 03, S/ 3 175 732.15 inc. I.G.V.; Prestación Adicional de Obra N° 04, S/ 13 245 278,03 inc. I.G.V., Presupuesto Deducitivo Vinculante N°1, S/ 10763 222,57 inc. I.G.V. con precios a junio 2018, 456123.80 inc. I.G.V. , Presupuesto Deducitivo Vinculante N° 02, S/ 200 085,13 inc. I.G.V.; Prestación Adicional N°08, S/1736 649,78 inc. I.G.V. con precios a junio 2018, aprobado con R.D N° 0784-2021-MTC/20 del 30.04.2021,Presupuesto deducitivo Vinculante N° 03 S/ 3 138,62 inc. I.G.V, Prestación Adicional N°09, S/ 10 819 655,88 inc. I.G.V. Deducitivo Vinculante N° 04, S/ 2 216 811,87 inc. I.G.V, Prestación Adicional de Obra N° 10, S/ 8 824 724,01 inc. I.G.V. ,Deducitivo vinculante N° 05, S/ 6 930 066,04 inc. I.G.V. Prestación Adicional de Obra N° 11, S/528 165,98 inc. I.G.V., Deducitivo Vinculante N° 06, S/ 6 735,48 inc. I.G.V. , Prestación Adicional de Obra N° 12 S/15 387 854,66 inc. I.G.V., Deducitivo Vinculante N° 07, S/ 8 566 696,04 inc. I.G.V. , Prestación Adicional de Obra N° 13S/ 1 372 759,56 inc. I.G.V., Deducitivo vinculante N° 08 S/ 3 664 241,99 inc. I.G.V. , Prestación Adicional de Obra N° 14, S/ 5 720 131,24 inc. I.G.V., deducitivo Vinculante N° 09, S/ 415 235,89 inc. I.G.V., Prestación Adicional de Obra N°15 Improcedente , Deducitivo Vinculante N° 10 Improcedente , Prestación Adicional de Obra N° 16 S/ 21,359,711,22 inc. I.G.V., Deducitivo Vinculante N° 11, S/ 3 278 107,71 inc. I.G.V. Prestación Adicional de Obra N° 17 S/ 1 834 818,72 inc. I.G.V. , Prestación Adicional de Obra N° 18, S/ 1 278 449,31 inc. I.G.V., Deducitivo Vinculante N° 12 S/ 1 246 979,11 inc. I.G.V. últimamente se ha aprobado el Adicional No. 20 y 21 esta en tramite un adicional No. 22 y 23.
- 3) MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES) : Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado. un tramite de MAYORES CANTIDADES No. 1 y 2 a la Entidad correspondientes a MEJORAMIENTOS EN LA VIA A NIVEL DE SUBRASANTE el cual unos sectores han sido autorizadas por la supervisión. Se ha realizado la constatación inicial de mayores cantidades No.1 Y 2 de MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE.
- 4) DEDUCTIVOS: NO SE TIENE INFORMACION DE DEDUCTIVOS NO VINCULANTES
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, en los frentes de trabajo,
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: Hasta los momento la Vía requiere mantenimiento constante , porque las precipitaciones ocurridas en horas de la noche ocasionan derrumbes , Actualmente es necesario realizar mantenimiento anti polvo en la via, han disminuido notablemente las precipitaciones en el tramo1.
- 7) RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
- a) PERSONAL: En el sitio de campamento y campo se verifica la presencia del personal técnico y especialista del contratista trabajando
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: :La verificación de maquinarias en el sitio de la obra hasta los momentos son los siguientes : 3 motoniveladora, 3 vibro compactadoras, 4 cargador frontal , 4 mini compactadoras de rodillo,1camión de bombeo de concreto, 1 retroexcavadora, 8 excavadora de oruga, 1 excavadora neumática, 1 rock drill,, 31 camiones de volteo, 4 camión cisterna, tractor. (Se han movilizdo hacia el TRAMO 3 o retirados del tramo 1 :1 pavimentadora, 1compactadoras de rodillo neumático y 1 compactadora de rodillos1 camión imprimador, 1 mini cargador, vibrocompactadoras, 1 camión cisterna 10 volquetes) , La relación de equipos se estan verificando día a día de acuerdo a estipulado en los términos de referencia y de la información verificada in situ y la suministrada por la Supervisión.
- DE LA SUPERVISIÓN
- a) PERSONAL : Se verifica hasta la fecha la presencia de Gerente vial (cuando el jefe de Supervisión esta de bajada) ,jefe de supervisión tramo 1 especialistas ambiental seguridad, suelos y pavimentos, estructura y obras de arte, trazo y topografía, liberación de predios, arqueólogo, Salud ocupacional y geología , técnicos y personal administrativo, laborando en oficina, campo y realizando sus actividades en laboratorio.
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado hasta hoy 6 camionetas 4x4 y 3 combi, día a día se realiza la verificación del cumplimiento de los términos de referencia.
- 8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de registro de INCIDENTES en el tramo 1
- 9) INTERFERENCIAS: A la fecha se mantienen interferencias descritas en el estudio y otras nuevas que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución del proyecto, correspondiendo entre otras a: presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua potable y/o alcantarillado, postes de energía eléctrica y/o telecomunicaciones en zonas pobladas, canales no revestidos, presencia de Buzones, entre otros.
- 10) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy fue SOLEADO toda la mañana y tarde , con garuas dispersas en el tramo 1 (OBRAS INICIALES T1) en la Vía Huánuco -La unión - Huallanca. Hasta ahora con la valorización del mes de Abril 2023 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión, CONTINUA ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra con rendimientos bajos, hoy fue soleado en el sector, con garuas dispersas en sectores. Se ha notado la necesidad de más maquinarias y equipos y se esta realizando cortes y transportes en horas de la noche, cuando el clima lo permite. Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) . Hecho que ocasiona salir a las 6 am con los vehículos de la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión y regresar a la hora que disponga la Supervisión y finalmente llegar en horas de la tarde a realizar los informes diarios y mensuales en gabinete, ocasionando trabajar mas de 12 horas al día y con la limitación del cumplimiento de las funciones asignadas

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Recomendaciones:**

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal y accesos, puesto que existen tramos sin pavimentar que están en muy malas condiciones, se está generando mucho polvo, donde dos cisternas todavía es insuficiente para todo el tramo 1, ocasionando problemas sociales. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento y reparación inmediata de sus Maquinarias y equipos, puesto que existen muchos equipos malogrados en la vía y en taller sin repuestos y en mal estado de funcionamiento, se ha incrementado el porcentaje de maquinaria dañada y se está reduciendo la cantidad de maquinaria y equipo destinándolos a otros tramos en vez de aumentar en esta temporada de Verano.

Se recomienda al Contratista de Obra el cumplimiento de la programación de obra a fin de evitar retrasos injustificados en su ejecución, así como el cumplimiento de las estipulaciones contractuales descritas en el Contrato de Obra.

Se recomienda al contratista no realizar movilizaciones Y desmovilizaciones de equipos desde el TRAMO 1 AL TRAMO 3 Y VICEVERSA, sin la previa autorización escrita de la Supervisión

Se recomienda al Contratista la inclusión de maquinarias NUEVAS , EN MUY BUENAS CONDICIONES en el TRAMO 1, para incrementar el porcentaje de avance de la obra,

Se recomienda a la Contratista la presentación de las prestaciones adicionales a TIEMPO que son necesarias para el avance de las obras en sector inestable KM. 17+000, sector de los canales de distribución de agua de SEDA HUANUCO y adicionales nuevos pendientes.

Se recomienda a la Supervisión la entrega mensual del control de permanencia del personal clave de la Supervisión.

Se recomienda a la Supervisión el control de todos los recursos de la Contratista, donde revisen y evalúen e informen a la Entidad el cumplimiento de los TDR del contrato (todos los equipos tienen que estar en buen estado de operación, equipados y con control de mantenimiento)

Se recomienda a PROVIAS NACIONAL (DERECHO DE VIA) y Supervisión solicite a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de interferencias (viviendas, terrenos, postes de energía eléctrica y/o de telecomunicaciones, torres de media o baja tensión y aprobación de los DMEs y áreas auxiliares, tramitados y/o solicitados por la Contratistas

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. A la fecha NO hay Camioneta, ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo

Auditoria Fecha De Creación:

20-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 52+090 AL KM. 52+150 (SECTOR 35)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 35 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 52+090 al Km. 52+150 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-05-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 48+720 AL KM. 48+760 (SECTOR 34); KM, 48+620 AL KM, 48+720 (SECTOR 33); KM, 48+550 AL KM. 48+620 (SECTOR 32)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 34, 33 Y 32 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 48+760 al Km. 48+550 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 34, 33 y 32 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 34, 33 y 32 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS, de acuerdo a las partidas a ejecutar del presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 48+460 AL KM. 48+550 (SECTOR 31) ; KM, 48+360 AL KM, 48+460 (SECTOR 30) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 31 Y 30 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 48+550 al Km. 48+360 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 31 y 30 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 31 y 30 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 47+700 AL KM. 47+800 (SECTOR 29)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 29 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 47+700 al Km. 47+800 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 47+520 AL KM. 47+620 (SECTOR 28)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 28 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 47+520 al Km. 47+620 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica en este sitio del sector 28 que se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 45+700 AL KM. 45+750 (SECTOR 27) ; KM, 45+400 AL KM, 45+470 (SECTOR 26) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 27 Y 26 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 45+700 al Km. 45+750 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 27 y 26 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 27 y 26 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 44+640 AL KM. 44+680 (SECTOR 25) ; KM, 44+550 AL KM, 44+640 (SECTOR 24) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 25 Y 24 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 44+640 al Km. 44+680 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 25 y 24 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 25 y 24 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 44+380 AL KM. 44+430 (SECTOR 23) ; KM, 44+300 AL KM, 44+380 (SECTOR 22) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 23 Y 22 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 44+380 al Km. 44+430 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 23 y 22 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 23 y 22 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 44+230 AL KM. 44+260 (SECTOR 21)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 21 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 44+230 al Km. 44+260 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 41+620 AL KM. 41+520 (SECTOR 20)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 20 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 41+620 al Km. 41+520 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 41+420 AL KM. 41+520 (SECTOR 19) ; KM. 41+320 AL KM. 41+420 (SECTOR 18) y KM. 41+220 AL KM. 41+320 (SECTOR 17)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 19,18 Y 17 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 41+520 al Km. 41+220 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 19,18 y 17 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 19,18 y 17 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 41+120 AL KM. 41+220 (SECTOR 16)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 16 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 41+120 al Km. 41+220 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 40+920 AL KM. 40+940 (SECTOR 15) ; KM, 40+820 AL KM, 40+920 (SECTOR 14) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 15 Y 14 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 40+940 al Km. 40+820 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 15 y 14 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 15 y 14 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 40+760 AL KM. 40+820 (SECTOR 13)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 13 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 40+760 al Km. 40+820 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 36+640 AL KM. 36+710 (SECTOR 12)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 12 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 36+640 al Km. 36+710 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 32+760 AL KM. 32+840 (SECTOR 11) ; KM, 32+660 AL KM, 32+760 (SECTOR 10) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 11 Y 10 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 32+840 al Km. 32+660 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 11 y 10 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guifo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 11 y 10 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 30+220 AL KM. 30+300 (SECTOR 9) ; KM, 30+170 AL KM, 30+220 (SECTOR 8) VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 9 Y 8 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 30+300 al Km. 30+170 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 9 y 8 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 9 y 8 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 29+750 AL KM. 29+851 (SECTOR 7) ; KM, 29+655 AL KM, 29+750 (SECTOR 6)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 7 Y 6 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 29+750 al Km. 29+851 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 7 y 6 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 7 y 6 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 29+470 AL KM. 29+570 (SECTOR 5) ; KM, 29+450 AL KM, 29+470 (SECTOR 4)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 5 Y 4 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 29+450 al Km. 29+570 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 5 y 4 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 5 y 4 que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

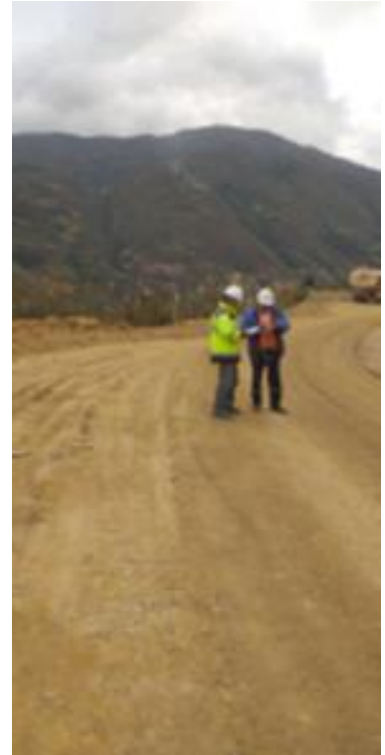

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 26+405 AL KM. 26+485 (SECTOR 3)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN EL SECTOR 3 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 26+405 al Km. 26+485 Se realiza visita de constatación de actividades ejecutadas, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos propuesto en la Variación No. 25 “VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I” acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista, suficientemente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente de la Contratista, respectivamente para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, Se verifica que actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en este lugar, de acuerdo a las partidas a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-05-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 25+620 AL KM. 25+700 (SECTOR 2) ; KM, 25+570 AL KM, 25+620 (SECTOR 1)
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN LOS SECTORES 2 Y 1 (PROPUESTA ADICIONAL No. 25)

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 25+700 al Km. 25+570 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo, realizando el recorrido en forma regresiva, donde se verifica las actividades ejecutadas hasta la actualidad de mejoramientos de suelos en los sectores 2 y 1 propuesto en la Variación No. 25 "VARIACION DE METRADOS, POR NUEVOS SECTORES DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE – TRAMO I" acompañado por el Técnico Francisco Inga por la Supervisión y el Ing. Guilfo Taffur especialista de Suelos y Pavimentos de la Contratista para verificar las actividades ejecutadas en el sitio donde se propone mejoramientos de suelos a nivel de subrasante, actualmente el sitio se mantiene a nivel de terreno natural y se VERIFICA en los sectores 2 y 1 (CARRIL IZQUIERDO) que hasta la fecha NO se ha realizado ninguna actividad de MEJORAMIENTOS DE SUELOS en esos lugares, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el presupuesto del adicional No. 25 propuesto.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

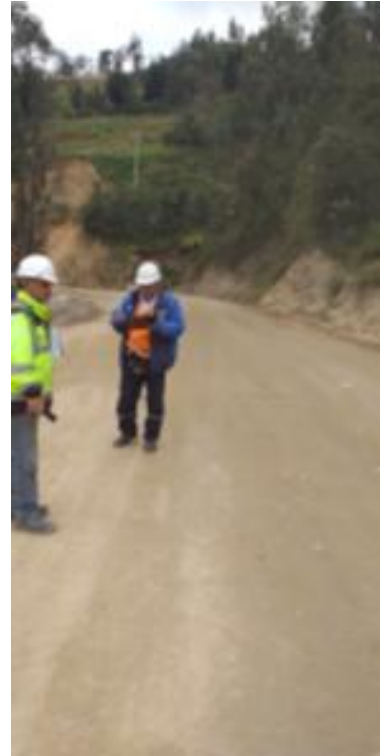

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-05-2023
