





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	75	02 - 05 - 2023	Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III	MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
 FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
 CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICOPUNTO) KM 102+819 Y CULMINA (HUALLANCA) KM 150+421.
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION (CONTRATO N° 127-2018-MTC/20)
 SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB (CONTRATO N° 144-2018-MTC/20)
 PRESUPUESTO DE CONSORCIO SUPERVISOR OI-3: S/ 123'625,905.13 (INC. IGV)
 PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1241'495,685.46 (INC. IGV)
 PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA OI-3: S/ 341'566,235.85 (INC. IGV)
 PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCION DE OBRA OI-3: S/ 344'313,944.61 (INC. IGV)
 ENTREGA DE TERRENO: 27-11-2020
 INICIO DE OBRA: 28-11-2020
 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 660 DIAS
 TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18-09-2022



Conclusiones:

I). TRAMO III DEL KM 102+819 (TINGO CHICO) AL KM 150+421 (HUALLANCA), LONGITUD 47.602 KM:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

1.1. ASIENTO N° 1772 DEL CONTRATISTA DE FECHA 29-04-2023. ASUNTO: COMUNICAMOS LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. REFERENCIAS: a) CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20. b) CARTA N° 414-23-LMAQ/RCR20-T3-VALORIZACION N° 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

1.2. ASIENTO N° 1773 DEL CONTRATISTA DE FECHA 29-04-2023. ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LAS PROGRESIVAS:

-KM 112+733.50 AL KM 112+749.21

-KM 116+805.00 AL KM 116+837.46

-KM 117+176.00 AL KM 117+190.74

VERIFICANDOSE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL METRADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

-200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

-600 DRENAJE

-700 TRANSPORTE

-900 PROTECCION AMBIENTAL

REFERENCIA:

a)ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20

b)DIRECTIVA N° 002-2021-2021-MTC/20 DE FECHA 15.10.21

1.3.ASIENTO N° 1774 DEL CONTRATISTA DE FECHA 29-04-2023. ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LAS PROGRESIVAS:

-KM 117+790.80 AL KM 117+814.77

-KM 117+965.00 AL KM 117+980.00

-KM 118+170.00 AL KM 118+199.45

-KM 118+463.03 AL KM 118+498.20

-KM 119+847.50 AL KM 119+867.50

-KM 136+070.00 AL KM 136+155.00

VERIFICANDOSE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL METRADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

-200 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-600 DRENAJE

-700 TRANSPORTE

-900 PROTECCION AMBIENTAL

REFERENCIA:

a)ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20

b)DIRECTIVA N° 002-2021-2021-MTC/20 DE FECHA 15.10.21

2. AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 82 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 79 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 02 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 POR 01 DIA CALENDARIO (PROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 05 POR 01 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 POR 01 DIA CALENDARIO (PROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 07 POR 01 DIA CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 08 POR 28 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 13 POR 34 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 34 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3

EVENTO COMPENSABLE N°02.- MEDIANTE CARTA N° 313-22-LMMQ/RCR20-T3

EVENTO COMPENSABLE N°03.- MEDIANTE CARTA N° 387-22-LMMQ/RCR20-T3

EVENTO COMPENSABLE N°04.- MEDIANTE CARTA N° 548-22-LMMQ/RCR20-T3

4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) - (ADICIONALES DE OBRA)

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-LMMQ/RCR20-T3.

ADICIONAL N°02.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/587

ADICIONAL N°03.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/322

ADICIONAL N°04.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/386

5. MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS)

MAYORES METRADOS N° 01.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-263.

MAYORES METRADOS N° 02.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-751.

MAYORES METRADOS N° 03.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-887.

MAYORES METRADOS N° 04.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-981.

MAYORES METRADOS N° 05.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-1079.

MAYORES METRADOS N° 06.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CGS-23-014.

6. DEDUCTIVOS

NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS A LA FECHA

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZO EL RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE



POLVO.

TAMBIEN SE SUGIERE QUE SE DEBE TENER UN CRONOGRAMA ADECUADO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, YA QUE SE OBSERVA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

SE ESTA REALIZANDO LA CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES DE TALUDES

8. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA CON USO DE MAQUINARIA, PARA FACILITAR EL NORMAL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DE LA OBRA

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL CONTROL DE OBRA.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:

CANTIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.

10. PACRI

SE ATIENDE QUEJAS Y OBSERVACIONES EN OFICINA PACRI DE LA SUPERVISION.

11. ARQUEOLOGÍA

NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS DIFERENTES FRENTES O PROGRESIVAS DEL TRAMO III.

12. INCIDENTES

HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA

HOY NO CUENTO CON APOYO DE VEHICULO POR PARTE DE LA SUPERVISION, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO

13. OTROS

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

-SE REALIZO EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: TOPOGRAFIA, SECRETARIA E IMPACTO AMBIENTAL UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO, KM 130+360

-SE REALIZO EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: LIBERACION DE PREDIOS, SEGURIDAD - ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y SUELOS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO, KM 130+360

-SE REALIZO EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: METRADOS-COSTOS-VALORIZACION, JEFATURA DE SUPERVISION Y OBRAS DE ARTE UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO, KM 130+360

-SE REALIZO EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: ADMINISTRACION, RELACIONES COMUNITARIAS Y MEDICO OCUPACIONAL UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO, KM 130+360

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, QUE DEBE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO.

EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EQUIPO DE CAMPO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA VIA.

EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN SEMANAL.

SE RECOMIENDA Y SE HACE EL PEDIDO A PROVIAS NACIONAL REALIZAR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA REALIZAR MI TRABAJO DE CAMPO EN OBRA, NO TENGO EL APOYO CERTERO DE LA PRESTACION DE MOVILIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISION.

Auditoria Fecha De Creación:

02-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-05-2023

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISION
PROGRESIVA: KM 130+360

PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: TOPOGRAFIA, SECRETARIA E IMPACTO AMBIENTAL UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO:
10 COLABORADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:

UTILES DE ESCRITORIO, LAPTOPS, COMPUTADORAS DE MESA, ESCRITORIOS

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-05-2023

Actividades:


OFICINA DE LA SUPERVISION
PROGRESIVA: KM 130+360
PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: LIBERACION DE PREDIOS, SEGURIDAD - ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y SUELOS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO:
03 COLABORADORES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:
UTILES DE ESCRITORIO, LAPTOPS, COMPUTADORAS DE MESA, ESCRITORIOS


2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-05-2023

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISION
PROGRESIVA: KM 130+360
PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: METRADOS-COSTOS-VALORIZACION, JEFATURA DE SUPERVISION Y OBRAS DE ARTE UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO:
07 COLABORADORES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:
UTILES DE ESCRITORIO, LAPTOPS, COMPUTADORAS DE MESA, ESCRITORIOS

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

02-05-2023

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISION
PROGRESIVA: KM 130+360
PERSONAL DE LA SUPERVISION, EN LAS OFICINAS DE: ADMINISTRACION, RELACIONES COMUNITARIAS Y MEDICO OCUPACIONAL UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION-DOS DE MAYO – HUANUCO

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO:
01 COLABORADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:
UTILES DE ESCRITORIO, LAPTOPS, COMPUTADORAS DE MESA, ESCRITORIOS


4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

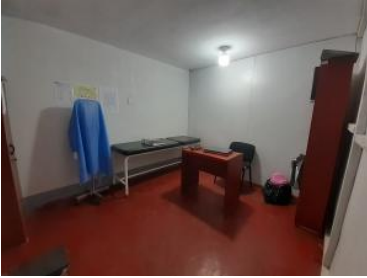

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-05-2023



Fotos:
