



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	136-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	07-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 136-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 07 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN



Recomendaciones:

SE TUVO CONSTATAACION POLICIAL AL REDEDOR DE LAS 08:30 AM, EN LA PROGRESIVA KM 01+890 L/I A SOLICITUD DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE.

INDICA EL SR. ZAPATA RODRIGUEZ (TRABAJADOR DE ELECTRO SUR ESTE Y ACOMPAÑANTE DE LA POLICIA) QUE ESTA TORRE ES LA Nº 10 CON 60,000 VOLTIOS Y QUE SUMINISTRA FLUIDO ELECTRICO A ANDAHUALIAS Y CHALLHUANCA.

ESTAN SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN ESTA ZONA, POR QUÉ ESTAN DESESTABILIZANDO LA CIMENTACION DE LA TORRE DE ALTA TENSION.

EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PLAN DE TRABAJO AL REDEDOR Y EN LA CIMENTACION O BASE DE LA TORRE, ANTE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+600 L/I
INTERFERENCIAS

CDescripcion _____ :

CRTG REGISTRA UN POSTE SIN CABLEADO PARA SU RE UBICACION

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+020

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)

02 EXCAVADORAS S/O
32 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+510 AL KM 0+740

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION CON EL CONO DE ARENA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300

OBRAS DE ARTE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA TMC - RELLENO ESTRUCTURAL

DENSIDAD DE CAMPO - CONO DE ARENA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

DESENCOFRADO Y CURADO DE CABEZAL DE ALCANTARILLA

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6 +152

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 48"

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCUTRAL

6

CONTROL DE CALIDAD - GRADO DE COMPACTACION CONO DE ARENA.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+680 L/I

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE

01 CARGADOR FRONTAL
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MARCO DE CONCRETO

CDescripcion _____:

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

8

HABILITADO DE ACERO DE LOSA DE FONDO Y MUROS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+800

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____:

CORTE DE MATERIAL EN PLATAFORMA

02 EXCAVADORAS S/O
23 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+890 L/I

TORRE DE ALTA TENSION ELECTRICA

CDescripcion _____ :

SE TUVO CONSTATACION POLICIAL AL REDEDOR DE LAS 08:30 AM

A SOLICITUD DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE.

INDICA EL SR. ZAPATA RODRIGUEZ (TRABAJADOR DE ELECTRO SUR ESTE Y ACOMPAÑANTE DE LA POLICIA) QUE ESTA TORRE ES LA Nº 10 CON 60,000 VOLTIOS Y QUE SUMINISTRA FLUIDO ELECTRICO A ANDAHUALIAS Y CHALLHUANCA.

ESTAN SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN ESTA ZONA, POR QUÉ ESTAN DESESTABILIZANDO LA CIMENTACION DE LA TORRE DE ALTA TENSION.

EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PLAN DE TRABAJO AL REDEDOR Y EN LA CIMENTACION O BASE DE LA TORRE.

10

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

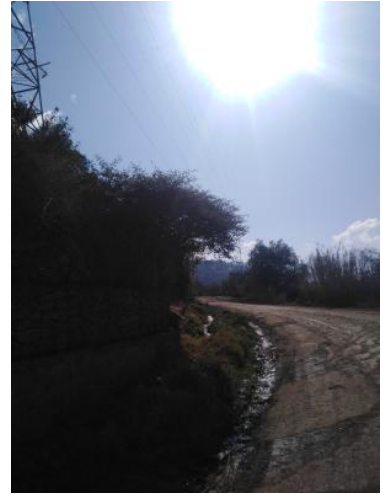

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+580

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

BANQUETAS DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O

11

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023
