




**BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

<b>N°- INFORME</b>		<b>FECHA DE INFORME</b>	
0097		16-09-2024	
<b>NOMBRE DE LA OBRA :</b>		<b>CONFIRMACION BITACORA :</b>	<b>PERSONAL ENCARGADO :</b>
SELVA ALEGRE - LA CALZADA		Si	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
<b>DATOS MULTIMEDIA - FOTOS BITACORA :</b>			
<b>Cuaderno De Obra 1:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<b>Cuaderno De Obra 2:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<b>Cuaderno De Obra 3:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	
<b>Cuaderno De Obra 4:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<b>Cuaderno De Obra 5:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<b>Cuaderno De Obra 6:</b>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	
<b>ASUNTO :</b>			
<p>NUMERO DE INFORME No. 0097-2024          CONTRATO DE OBRA: No. 031-2022-MTC/20.2 CON PRECIOS DE AGOSTO DE 2021          EMPRESA CONTRATISTA: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU          OBRA: SALDO DE OBRA: "CULMINACION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME PE-5N (LA CALZADA)          MONTO DE LA OBRA: S/44'873,763.87 PLAZO DE EJECUCION: 190 DIAS CALENDARIO          SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR ALEGRE LA CALZADA (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU y GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C.)          CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2022-MTC/20.2 FECHA: 19-01-2022          MONTO SUPERVISION: 3,799,999.63 -Mediante OFICIO N° 905 - 2024-MTC/20.9 de fecha 23 de abril de 2024, la Entidad comunica el reinicio de ejecución de obra a partir del 22 de abril de 2024 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD DESDE 22-04-2024 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A</p>			

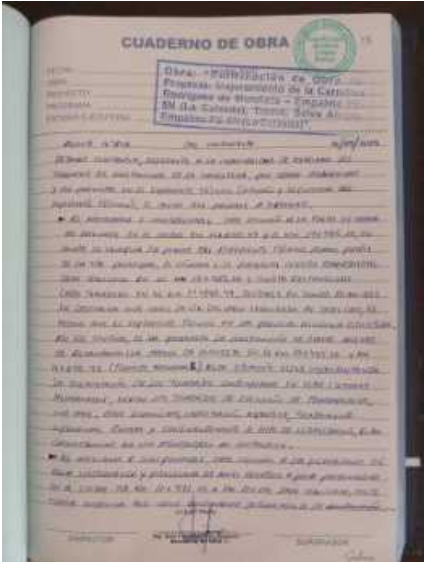

<p>LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA SELVA ALEGRE - LA CALZADA EN LAS PROGRESIVAS 0+000 A 12+800 LABORES DE OFICINA - REDACCION DE INFORMES</p>
<p><b>CONCLUSIONES :</b></p> <p>El saldo de obra del tramo SELVA ALEGRE- LA CALZADA, se encuentra atrasada con un 54.87 % de AVANCE ( aproximadamente hasta el 15-08-2024) - HOY NO HUBO ACTIVIDADES EN CAMPO, La Contratista hoy no realizo actividades en la obra, por condiciones climatológicas adversas. la Supervisión realizo un recorrido en campo para verificar las actividades paralizadas , laborando medio dia en campo. - Actualmente la planta chancadora, esta sin actividad, se ha dañado un eje , la producción de material granular para TSB esta paralizado. - Se ha iniciado desde el día 27-08-2024 la colocación de carpeta asfáltica, donde se desconoce la ubicación exacta de la planta de asfalto y la forma de elaboración de la mezcla asfáltica que es colocada en obra, esta actividad se esta realizando con el control y con la autorización de la Consultora de Supervisión. - Se observa que el asfaltado se esta realizando de manera interrumpida y no de forma continua. hoy no se ha realizado labores de asfaltado. - Se esta colocando material de base granular en las progresivas Km. 18+400 al Km. 20+000 se desconoce la procedencia del material de base granular que actualmente se esta colocando en la vía. - La Supervisión tiene los equipos de laboratorios con las calibraciones VENCIDAS, se desconoce donde esta realizando los ensayos y controles del asfalto colocado y los trabajos de suelos y pavimentos de concreto. - La Supervisión continua utilizando solo 2 vehículos para el recorrido en obra, de los 4 existentes, quedan 2 vehículos que estan guardados o sin utilizar por falta de combustible</p>
<p><b>1- CUADERNO DE OBRA :</b></p> <p>El cuaderno de obra esta en manos de la Supervisión. hoy se ha logrado acceso al nuevo cuaderno de obra No. 09, donde la anotación mas importante desde el 07-09-2024 al 10-09-2024 es el siguiente: ASIENTO No. 848 DEL CONTRATISTA DEL 10-09-2024 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE OBRAS REQUERIDAS Y NO PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO En resumen el Contratista anota necesidad de construcción de alcantarillas marco en las progresivas 11+840 y 19+485 que están incluidos en el trámite del adicional No. 06 que hasta la fecha se espera su aprobación, para poder iniciar su construcción. también anota la necesidad de construcción de subdrenaje en las progresivas Km, 11+775 al Km. 12+120 que esta incluido en el adicional No. 06 , en espera de aprobación. Con respecto a la rotonda anota que se espera el pronunciamiento técnico de IIRSA NORTE para determinar una posible modificación con respecto al expediente técnico, esto ocasionaría retrasos, anotan que dejan constancia que se aguarda el pronunciamiento de la Entidad, para la ejecución de los trabajos.</p>
<p><b>2- AMPLIACIONES DE PLAZO :</b></p> <p>SE HA TRAMITADO Y APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO No. 3 ( POR 16 DIAS ) , No. 4 ( POR 19 DIAS ) , No. 5 ( POR 43 DIAS ) Y No. 14 ( POR 32 DIAS ) , HAN SIDO IMPROCEDENTES LOS TRAMITES DE AMPLIACION DE PLAZO No.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,23,24,25 Y 26, ADEMÁS NO FUE APROBADO POR SUPERVISION Y ESTA EN REVISION DE LA ENTIDAD LA AMPLIACION DE PLAZO No. 21,22,27,28 Y 29. Cabe precisar que, a través de las Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas – JRD, se otorgó a favor del Contratista la siguiente cantidad de días: CONTROVERSIA No. 3 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 6) (POR 17 DIAS) CONTROVERSIA No. 4 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 7 Y 8) ( POR 19 Y 20 DIAS); CONTROVERSIA No. 6 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 12) ( POR 51 DIAS) Y CONTROVERSIA No. 7 ( AMPLIACION DE PLAZO No.17) ( POR 04 DIAS) ( SOLO TIENE APROBADO UNA PRORROGA HASTA EL 06-12 2023) y últimamente de acuerdo a la decisión de la JRD No. 01, 06,07,11,13 y 14 se ha aprobado 172 DIAS adicionales. (PRORROGA HASTA 26-10-2024)</p>
<p><b>3- ADICIONALES DE OBRAS :</b></p> <p>SE HA TRAMITADO Y APROBADO ADICIONAL No. 2 APROBADO SEGUN RD No.004-2023-MTC/ 20.9 DE FECHA 11-08-2023 ACTUALMENTE EN EJECUCION. Se ha tramitado un ADICIONAL No. 06, EL cual ha sido observado y devuelto a la Contratista, se ha subsanado las observaciones y se ha tramitado a la Entidad para su análisis y aprobación</p>
<p><b>4- MAYORES METRADOS :</b></p> <p>SE HA TRAMITADO Y AUTORIZADO MAYORES METRADOS ( POR MEJORAMIENTOS DE SUELOS) IMPACTANDO PARTIDAS DE 207.B Y 211.A, MAYORES METRADOS EN DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS) IMPACTANDO LAS PARTIDAS 700 DE TRANSPORTE Y 209.A CONFORMACION (EN EJECUCION) Y MAYOR METRADO No. 3 IMPACTANDO LAS PARTIDAS DE EMBOQUILLADO DE PIEDRA. 503H, 516A Y 519A</p>
<p><b>5- DEDUCTIVOS :</b></p> <p>SE HA APROBADO UN DEDUCTIVO VINCULANTE No. 2 al aprobar el ADICIONAL No. 02, hasta los momentos no hay mas deductivos</p>
<p><b>6- PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL :</b></p> <p>SE UTILIZA BAÑOS PORTATILES TIPO DISAL en diferentes sitios donde se encuentran laborando, dentro de la via principal y en la planta chancadora de agregados</p>
<p><b>7- MANTENIMIENTO VIAL :</b></p> <p>SE UTILIZA UN CAMION CISTERNA QUE RIEGA 3 VECES AL DIA EN ZONAS URBANAS COMO LABOR ANTIPOLVO Y MANTENIMIENTO DE LAVIA(ES INSUFICIENTE)</p>
<p><b>8- RECURSOS OFERTADOS :</b></p> <p>RECURSOS OFERTADOS: DE LA CONTRATISTA: PERSONAL: Presencia del personal clave se aprecia en oficina como el residente, los especialistas de producción, seguridad de obra, Control de calidad, Ambiental, Suelos y pavimentos, Obras de arte y Costos y valorizaciones. MAQUINARIAS Y EQUIPOS : los equipos y maquinarias apreciados hasta los momentos son :3 Excavadoras, 2 cargador frontal, 3 retroexcavadoras , 4 compactadora de rodillo, 2 mini rodillo, 1 minicargador frontal , 3 motoniveladoras, 11 camiones de volteo activos ( 4 CAMIONES DE VOLTEO DE 15 M3 y 7 CAMIONES DE 20 M3) 2 camión cisterna, 1 camión imprimador ( equipo de pavimentación , 1 compactadora de rodillo, 1 compactadora de ruedas neumáticas ) hoy sin actividad. Día a día se ira incluyendo las maquinarias y equipos que se aprecien en campo y que estén operativos. HOY NO HUBO ACTIVIDADES EN OBRA por CONDICIONES DE LLUVIAS INTENSAS EN LA MAÑANA Y TARDE RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISIÓN PERSONAL : Hasta la fecha se ha verificado la presencia del jefe de supervisión , personal administrativo de la supervisión como administrador y personal técnico ,especialista ambiental, producción, estructuras y obras de arte, control de calidad, suelos y pavimentos, costos y valorizaciones y de seguridad, los demás se irán verificando día a día in situ. su incorporación a la obra. MAQUINARIA Y EQUIPOS Se ha apreciado 2 camionetas 4x4 para la obra y 2 conductores, ( hay 2 vehículos guardados y sin combustible) 1 estación total , 2 niveles topográficos, 7 winchas y accesorios hasta los momentos ( HOY solo se han movlizado dos vehículos , los demás inactivos por falta de combustible)</p>
<p><b>9- INCIDENTES :</b></p> <p>Hoy no se tiene información de INCIDENTES</p>
<p><b>10- PACRI :</b></p>



Hasta los momentos SE TIENE INFORMACION DE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD DE INTERVENCION EN EL INICIO DE LA VIA KM 0+000 ( OVALO LA CALZADA) POR TENER COMO INTERFERENCIA UNA VIA CONCESIONADA A IIRSA NORTE EL CUAL FALTA LA "AUTORIZACION DE USO DE DERECHO" y la opinión con respecto a la INCOMPATIBILIDAD de la estructura del pavimento del proyecto con la de la Vía Concesionada según la Contratista

**11- ARQUEOLOGÍA :**

Hasta los momentos NO APLICA ( se labora en una zona generalmente urbana

**12- OTROS :**

- Las condiciones del clima en la zona, hoy es mublado con lluvias intensas en horas de la mañana y en horas de la tarde y lluvias leves en horas de la noche. Hasta ahora con la última valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. el porcentaje de ejecución esta en 54.87% de avance (aproximadamente) Se tiene varias decisiones de la JRD , donde se han aprobado las decisiones No, 01,06,07,11,13 y 14 declarando precedente 172 días ( según supervisión) y 217 ( según Contratista) , esto tiene que ser aclarado a las partes, por el JRD .Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD.  
 - Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente contar con el apoyo de la Supervisión para poder estar en Campo, implicando una movilización limitada, y estar solo en los sitios donde disponga la supervisión ( SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTEN MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES  
 - Se participa a PROVIAS NACIONAL que mis labores realizadas inician desde las 7.30 am hasta la 12 am y de 1.30 pm hasta las 6 pm sin contar las labores de reportes diarios realizados en horas nocturnas o de madrugada

**RECOMENDACIONES :**

Se recomienda al contratista terminar las actividades de mejoramientos, construcción de sub base y base granular, TSB Y ASFALTO obras de arte, marcas en el pavimento y readecuación de los DME.  
 Se recomienda al Contratista incluir en la obra una nueva planta chancadora, porque la actual constantemente se esta dañando, es necesario tener una chancadora adicional.  
 Se recomienda a la Contratista informar de forma inmediata a la Supervisión y Entidad de como y donde elaboran la mezcla asfáltica para la construcción del pavimento asfáltico, porque ya han iniciado con las labores de imprimación y asfaltado, y hasta la fecha no hay movimiento de instalación ni movilización de una planta de asfalto en el sitio contemplado, de la obra, ni la producción de agregados, se esta produciendo la mezcla asfáltica de otro lugar y se esta colocando en obra, con la autorización de la Supervisión.  
 Se recomienda a la Supervisión y Contratista la oportuna subsanación de las observaciones en el trámite del adicional No. 06.para que sea tramitado a la Entidad, para que pueda emitir su opinión.  
 Se recomienda a la Supervisión, informar a la Entidad donde esta realizando los controles de calidad de la mezcla asfáltica colocada en el sitio y desde donde se esta realizando el transporte de la mezcla asfáltica, que difiere a lo considerado en el expediente técnico.  
 Se recomienda a la Supervisión la permanencia del personal Clave ,no coincide con el cronograma de permanencia presentado por el Supervisor a la Entidad  
 Se recomienda a la Supervisión la continua utilización y dotación de combustible a sus vehículos en la obra, esto puede afectar la calidad de la obra, el personal de supervisión y monitor de la Entidad han estado realizando los recorridos caminando, solo en zonas cercanas.  
 Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna de las asistencias en el sitio de trabajo, papeletas de salidas, permisos médicos, cronograma de permanencia del personal de supervisión y la entrega de los ruteos que efectúa cada uno de los vehículos que utiliza la Supervisión.  
 Se recomienda a la Supervisión el cumplimiento de sus compromisos laborales con su personal supervisor, por las constantes quejas por parte del personal de campo por la falta de pago por parte de la consultora CONSORCIO ALEGRE LA CALZADA, ocasionando malestar y desmotivación de los trabajadores. Hasta la fecha, continua este problema con sus trabajadores y ex trabajadores.  
 Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna al especialista de seguimiento de la Entidad, del cronograma de permanencia del personal especialista, técnico y administrativo MES A MES.,  
 Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna al especialista en seguimiento en Campo de la Entidad , de las planillas de gestión de control de asistencia diaria del personal, para evitar retrasos en la elaboración informes diarios y mensuales.  
 Se recomienda a la Supervisión la dotación oportuna de combustible a sus unidades vehiculares , el oportuno calibrado de los equipos de laboratorio y el oportuno pago a su personal supervisor, para lograr el normal y correcto control de la supervisión de la obra.  
 Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra, en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CAS . A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional ,ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA LA,PLANIFICACION DE ACTIVIDADES Y EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES

**PANEL FOTOGRÁFICO DE LA BITACORA DE OBRAS**

**1 PANEL FOTOGRÁFICO**

NIVEL INCIDENCIA	PROGRESIVA :	FECHA DE FOTOGRAFIA :	FECHA TOMA DE DATOS :
Crítico	Km. 12+950 (ACCESO DERECHO)	16-09-2024	17-09-2024

**ACTIVIDADES :**

PROGRESIVA KM. 12+950 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA SELVA ALEGRE LA CALZADA: ACCESO IMPRIMADO ( ACTIVIDADES PARALIZADAS)

**DESCRIPCION :**

En la progresiva KM. 12+950 se verifica insitu que estan paralizadas todas las actividades en esta zona y en campo, por condiciones climáticas adversas , ha estado lloviendo intensamente toda la mañana y tarde,

**DATOS MULTIMEDIA - FOTOS :**



<b>Foto Frente De Trabajo 1:</b>	<b>Foto Frente De Trabajo 2:</b>	<b>Foto Frente De Trabajo 3:</b>
		
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**2 PANEL FOTOGRÁFICO**

NIVEL INCIDENCIA	PROGRESIVA :	FECHA DE FOTOGRAFIA :	FECHA TOMA DE DATOS :
Crítico	Km. 12+790 carril derecho	16-09-2024	17-09-2024

**ACTIVIDADES :**

PROGRESIVA KM. 12+790  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA SELVA ALEGRE LA CALZADA: ASFALTO REALIZADO ( ACTIVIDADES PARALIZADAS)

**DESCRIPCION :**

En la progresiva KM. 12+790 se verifica insitu que estan paralizadas todas las actividades en esta zona y en campo, por condiciones climáticas adversas , ha estado lloviendo intensamente toda la mañana y tarde,

**DATOS MULTIMEDIA - FOTOS :**

<b>Foto Frente De Trabajo 1:</b>	<b>Foto Frente De Trabajo 2:</b>	<b>Foto Frente De Trabajo 3:</b>
		
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**3 PANEL FOTOGRÁFICO**

NIVEL INCIDENCIA	PROGRESIVA :	FECHA DE FOTOGRAFIA :	FECHA TOMA DE DATOS :
No Aplica	Km. 12+710 al Km. 12+740 (lado izquierdo)	16-09-2024	17-09-2024

**ACTIVIDADES :**

PROGRESIVA km. 12+710 al Km. 12+740 Li  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION EN LA VIA SELVA ALEGRE -LA CALZADA: COMPLEMENTO DE VEREDAS

**DESCRIPCION :**

En la progresiva Km. 12+720 lado izquierdo , se verifica que se ha realizado el encofrado para complementar una vereda, se utilizo herramientas menores, trabajaron 1 capataz, 2 obreros. Hoy no hay personal de la contratista laborando en campo.

**DATOS MULTIMEDIA - FOTOS :**



<p><b>Foto Frente De Trabajo 1:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<p><b>Foto Frente De Trabajo 2:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<p><b>Foto Frente De Trabajo 3:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>
--	---	--

**4 PANEL FOTOGRÁFICO**

NIVEL INCIDENCIA	PROGRESIVA :	FECHA DE FOTOGRAFIA :	FECHA TOMA DE DATOS :
No Aplica	KM. 12+180 acceso Id	16-09-2024	17-09-2024

**ACTIVIDADES :**

PROGRESIVA KM. 12+180 ( ACCESO DERECHO)  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS EN LA VIA SELVA ALEGRE - LA CALZADA: EQUIPOS DE PAVIMENTACION (SIN ACTIVIDAD)

**DESCRIPCION :**

En la progresiva Km . 12+180 se realiza el seguimiento y monitoreo a las actividades y recursos utilizados en la via selva alegre - la calzada, donde se verifica que continúan los equipos de asfaltado sin actividad, estacionados en un acceso derecho de la via principal. Se tiene programado reiniciar el asfaltado para el día miércoles 18-09-2024

**DATOS MULTIMEDIA - FOTOS :**

<p><b>Foto Frente De Trabajo 1:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<p><b>Foto Frente De Trabajo 2:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>	<p><b>Foto Frente De Trabajo 3:</b></p>  <p><a href="#">Ver imagen completa</a></p>
--	---	--
