

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69	Fecha Informe: 11-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades de mantenimiento vial, transporte de material granular a los sitios de acopio, ejecución de actividades de excavación, encofrado y vaciado de emboquillados en zona de alcantarillas. Se continua con el apoyo al Ing. especialista en obras hidraulicas e hídrológica en la evaluación del tramo I según expediente.

Conclusiones:

- Las actividades de mantenimiento vial se continua de acuerdo a los ultimos derrumbes ocasionados por las precipitaciones.
- Se ejecutan las actividades del contrato principal y adicionales aprobados, se incrementan los puntos de trabajo.
- La supervisión y la Empresa incrementan el personal especialista, tecnico y de campo.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial, la entrega de los planes de la semana, la lista del personal que esta ingresando a la obra y los recursos a incorporar. Es de vital importancia los planos del expediente en cada sitio de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: evaluación de obras de drenaje transversal

CDescripcion_____:

En las progresivas Km, 41+540, 41+844 y 41+990 se está evaluando las alcantarillas MCA de 1,5 x 1,5 m.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Zona de derrumbes de rocas

CDescripcion_____:

Entre las progresivas Km. 41+850 a 41+900 ha ocurrido derrumbes de rocas que están invadiendo la calzada.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

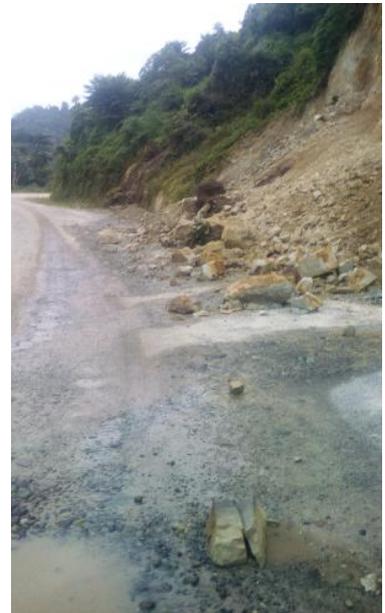

Fecha Toma De Datos:

12-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de emboquillado en salida de cabezales de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 35+445 se ha excavado, encofrado y vaciado un emboquillado con concreto de 175 kg/ cm² a los 28 días y piedras en la salida del cabezal de alcantarilla MCA de 3x2 m. (se emboquilló la mitad de la salida)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Evaluación de alcantarilla en progresiva 41+990

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+990 se ubica una alcantarilla MCA 1,5 x 1,5 m. donde se observa que el cabezal derecho se ha dañado, y esta completamente sedimentado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: derrumbe

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 43+880 existe un derrumbe que invade mas de la mitad de la calzada, este punto critico siempre se incrementa ante la presencia de lluvias en la zona, constantemente se esta arrimando material de derrumbe para mantener la transitabilidad.



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: evaluación de alcantarilla MCA de 1,50 x 1,50 m

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 44+100 se evalua el Funcionamiento de la alcantarilla MCA de 1,5x 1,5 m el cual necesita un muro como cabezal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Excavación

CDescripcion_____:

En la progresiva Km 52+645 se esta excavando y demoliendo una zona del cabezal para que las aguas superficiales drenen hacia la alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019

7
