



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: B O 009 | Fecha Informe: 29-04-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco | Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Trabajos de Movimiento de tierras, Perforación de roca , Voladura de Roca, Traslado de material excedente, conformación de DMEs, contaminación por levantamiento de polvo.
Firma de acuerdo con Comunidad Campesina de Nava, Acceso a las canteras Yanamayo y Rupay.

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras, corte y traslado de material hacia DMEs. Poca continuidad de riego de vías con cisternas como parte del mantenimiento esta originando levantamiento de polvo considerable en distintas zonas, afectando la visibilidad y salud de personas.
El día sábado 27-04-19 los directivos de la comunidad campesina Santo Domingo de Nava, firmaron el documento de acuerdo entre las partes para el acceso a las canteras Yanamayo y Rupay.
El día de hoy 29-04-19, en presencia de la directiva de la comunidad campesina Santo Domingo de Nava, se hizo la apertura y cambio de candados del portón de acceso hacia las canteras Yanamayo y Rupay.
El día de hoy se incorporo personal y recursos al equipo de supervisión, Ing. de Calidad, tercera cadista, sexto conductor y sexta camioneta.

Recomendaciones:

Incrementar la continuidad de riego con cisterna los distintos sectores de la vía para disipar el levantamiento de este y la afectación a las personas y medio ambiente.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 Mantenimiento de sector de vía

CDescripcion_____:

1 En el Km 136 030, se esta realizando el mantenimiento de dicho sector de la vía de un solo carril.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 Contaminación por levantamiento de polvo

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 138+030, debido a la gran movilización de vehículos pesados por traslado de material, se esta generando el levantamiento considerable de polvo en la zona, afectando la visibilidad y salud de la personas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

3

En el Km 137+980 se esta realizando la eliminación de material de la conformación de banquetta, trasladando el mismo al DME correspondiente. Se evidencia alto transito de vehículos pesados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 Apertura del ingreso a la cantera Rupay

CDescripcion_____:

4

El día de hoy 29-04-19, en presencia de la directiva de la comunidad campesina Santo Domingo de Nava, se hizo la apertura y cambio de candados del portón de acceso hacia la cantera Rupay.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
Apertura de acceso a la cantera Yanamayo

CDescripcion_____:

5

El día de hoy 29-04-19, en presencia de la directiva de la comunidad campesina Santo Domingo de Nava, se hizo la apertura y cambio de candados del portón de acceso hacia la cantera Yanamayo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 Firma de acuerdos para acceso a canteras

CDescripcion:
 El día sábado 27-04-19 los directivos de la comunidad campesina Santo Domingo de Nava, firmaron el documento de acuerdo entre las partes para el acceso a las canteras Yanamayo y Rupay.

Foto1:

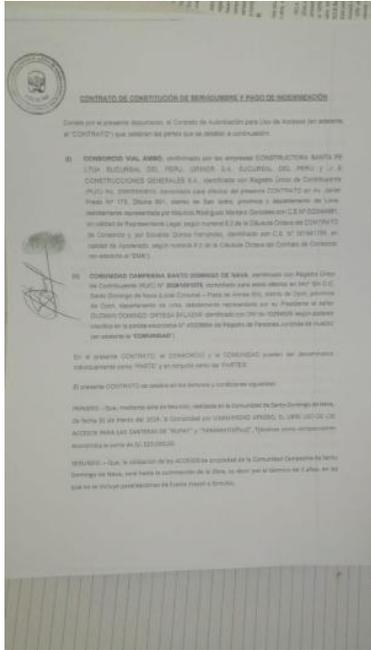


Foto2:


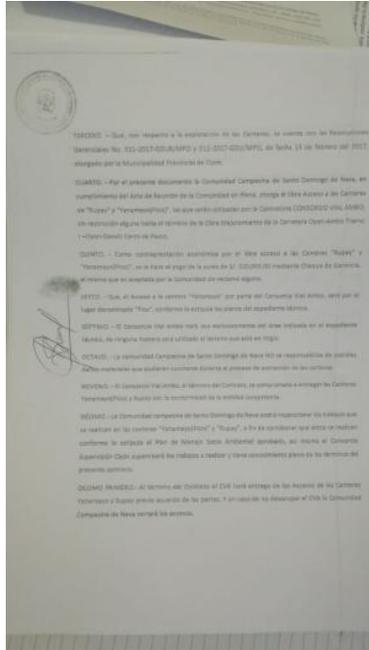


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019

6



Fotos:

