




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si
 Nro Inform e: 252
 Fecha Informe: 13-12-2019
 Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50
 Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

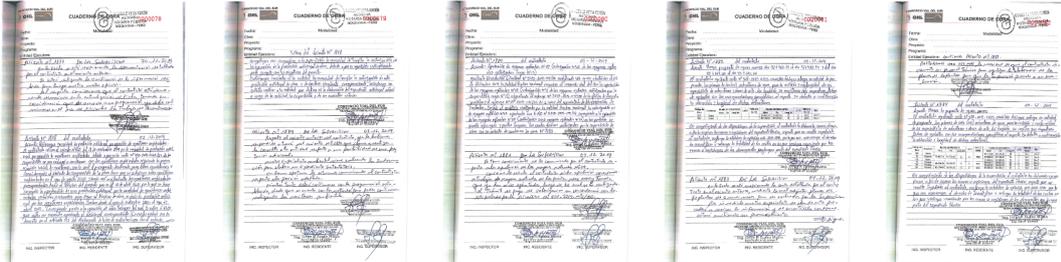

Asunto:
 Coordinaciones diversas en la oficina de Supervisión de obra.

Conclusiones:
 El servicio de movilidad asignado es requerido por el ingeniero Willy Alcarima y su equipo técnico, por lo cual mis actividades en campo se ven limitadas.

Se toma conocimiento que se realiza la actividad de corte en roca fija (proceso de voladura de rocas) entre los kms 132+380 @ 133+359 y 127+864 @ 127+868, con volumen de remoción aproximado de 86 m3.

Se adjunta en formato pdf, la asistencia del personal profesional, técnico, auxiliar y conductores correspondiente al 12.12.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-12-2019

Actividades:

Diversas coordinaciones en la oficina del Consorcio Supervisor de Obra- Consorcio Vial del Sur.

CDescripcion_____:

Especialidad liberación de predios, indica que se tiene pendiente la liberación de propiedades privadas con los siguientes propietarios:

- Sector Cogri: Propietarios señor Rodríguez entre los kms 101+560 @ 101+690 y señor Juan Caballero entre los kms 101+860 @ 101+880 aproximadamente.
- Sector Coalaque: Propietarios señora Mariela Baldarrago entre los kms 108+540 @ 108+560 y señor Leonidas Mamani 108+500 @ 108+520 aproximadamente. Indica que el primero sería un trámite aun largo dado la titularidad del predio (se encuentra a un nombre distinto del que dice ser la propietaria), en el segundo caso la carta de intención de compra estaría pendiente de envío por parte de la Entidad.
- Sector Puquina: Propietario señor Salinas quien cuenta con cuatro propiedades en distintos tramos entre los kms 151 @ 153 aproximadamente, de acuerdo a comunicación verbal de personal de PACRI, el señor Salinas ya habría aceptado la intención de compra por parte de la Entidad, sin embargo el Contratista habría realizado las coordinaciones del caso a fin de la movilización de maquinaria para actividades de movimiento de tierras en la zona, encontrando oposición a dichas actividades en los terrenos del señor Salinas.

Especialidad Hidráulica y drenaje vial, indica que viene preparando la solicitud de necesidades por interferencias de pases de riego y alcantarillas cuya descarga podría generar afectaciones a terrenos de cultivo.

Especialidad Puentes hace llegar el acta de actividades Durante de los mayores metrados N° 20 de actividades en la superestructura del puente Pachas, por lo que de acuerdo a la inspecciones en campo realizadas en diferentes oportunidades se da el visto bueno.

Especialidad Obras de Arte, la supervisión de obra estaría observando de forma reiterada la valorización de los Mayores Metrado N° 3, presentadas por el Consorcio Contratista y ejecutados en el año 2018.

Respecto a la valorización de los Mayores Metrados N° 6, presentados por el Contratista la Supervisión de obra estaría realizando su evaluación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-12-2019

1



Fotos:
