

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 026	Fecha Informe: 03-01-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 03 DE ENERO 2020

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

La Contratista de acuerdo a su programación semanal del 30.12.19 al 05.01.2020 solo esta ejecutando algunos frentes de trabajo el día de hoy viernes 03 de enero.

Solo se verifico que las obras de concreto en cuanto a encofrado de veredas continúan paralizadas; con limpieza en cunetas rectangulares para el sellado de juntas y colocado adecuado de las tapas prefabricadas de concreto en la Av. Rodriguez de Mendoza; y el mantenimiento de la vía.

El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra.

Con respecto al Cuaderno de Obra, continua siendo la última anotación el Asiento del cuaderno de obra el N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028.

La Supervisión continua con los tramites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.

La Contratista OBRAINSA ha presentado la Valorización Mensual a la Supervision.

La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Especialista en Calidad, según indica RRHH ha presentado su propuesta a la Entidad.

7.La Contratista no cuenta con la operatividad de su maquinaria y equipos, para continuar con los frentes de trabajo requeridos.

La Supervisión no cuenta con personal especializado en obra y tampoco cuenta con el personal ofertado, ademas que el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 20.12.19.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019. La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes. Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el presente mes. La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07 Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adiciones N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA ha realizado el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo. El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019 El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA continua con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también la renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Está pendiente la elaboración de los expedientes de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta la charla diaria y con el uso de los Equipos de Protección Personal. **MANTENIMIENTO VIAL:** La Contratista OBRAINSA ha realizando el control de polvo en la vía desde la progresiva Km 20+000 a Km 13+000, dando el mantenimiento requerido.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. Se recomienda a la Supervisión implementar el personal especializado en obra.
3. La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades para que el personal esté presente en los frentes de trabajo.
4. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía con el control de polvo para mantener su transitabilidad con seguridad.
5. La Contratista debe prevenir la operatividad de su maquinaria de acuerdo al mantenimiento requerido por kilometraje, para los frentes de trabajo programados.
6. La Supervisión debe verificar la operatividad de la maquinaria y equipos de la Contratista para los trabajos programados y evitar mayores atrasos.
7. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados en los diferentes frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-01-2020

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
102.A TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACION
Medida y Repintado de Progresivas

CDescripcion_____:

Con 01 Oficial + 04 Ayudantes, Se inicio en la progresiva Km 11+800


Foto1:



Foto2:



Foto3:

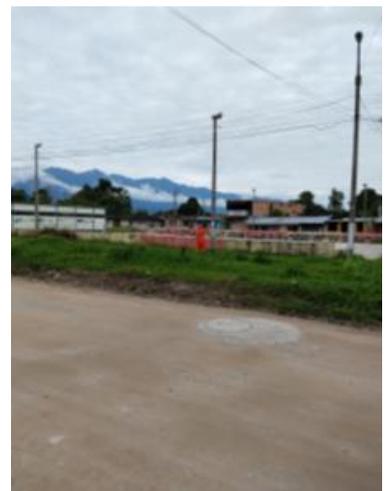

Fecha Toma De Datos:

03-01-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-01-2020

Actividades:

TALLER CONCHAN

CDescripcion_____:

2

Se observa el taller con maquinaria en refacción, como el Mixer por presentar fallas, y la Motoniveladora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 03-01-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
635.B CUNETAS RECTANGULARES Se observa limpieza y sellado de juntas para el colocado de tapas prefabricadas, en la progresiva Km 22+580 a Km 22+605 LI, y Km 22+495 a Km 22+560 LD

CDescripcion_____:
01 Oficial + 10 Obreros + 02 palas + 04 escobas + 02 carretillas + 02 motobombas + 01 compresora + 02 espatulas

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-01-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

VEREDAS Los trabajos continúan paralizados con el ENCOFRADO hasta la progresiva Km 22+640 en la AV. RODRIGUEZ DE MENDOZA LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____:

4

Solo se verifico que limpiaron para que el dren lateral evacuera las aguas de las precipitaciones pluviales de estos días.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-01-2020

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

5 01 Cisterna de agua para controlar el polvo en la vía, mantenimiento desde la progresiva Km 20+000 a Km 13+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-01-2020
