



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 9	Fecha Informe: 15-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

Esta anotado hasta el 8 de enero del 2020

Recomendaciones:

Se deben hacer anotaciones diarias para llevar al dia el cuaderno de obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 15-01-2020

Actividades:

Corte de material suelto y roca suelta. Ademas mantenimiento de vias y transporte de material suelto a DME

CDescripcion_____:

Se ejecutan trabajos en Progresiva 3+230 al 6+450 asi como en las progresivas Km 23+430 Al Km 27+100. Asi mismo se hace mantenimiento de vias entre progresivas 2+500 al Km 7+500. Tambien sr hace de conocimiento que se encuentra en obra el personal profesional y tecnico de la empresa suoervisora HOB. pero aun no instala su laboratorio de suelos. La empresa contratista trabaja con 53 volquetes de 15 cubos y en 2 turnos aprovechando las buenas condiciones climaticas.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

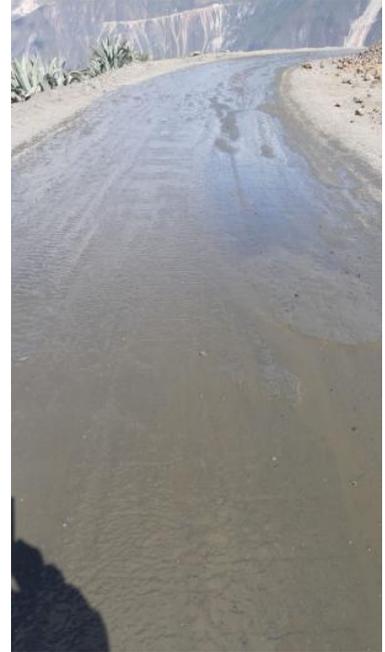

Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

1
