



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	41	02-03-2020	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 41



**Conclusiones:**

1) Cuaderno de obra:

- A la fecha se quedó en el Asiento N° 773 (del supervisor); el contratista se encuentra relleno.

Es necesario mencionar que, el relleno del cuaderno de obra se está realizando a destiempo a la fecha de la ejecución de las actividades.

2) Ampliaciones de Plazo: con CARTA N° 201-2020-CSO/JS de fecha 27/02/2020 se presentó la Ampliación de Plazo N°11 por la demora de aprobación del Mejoramiento de Suelo.

3) Mayores Metrados: Provias Nacional, supervisión y el contratista quienes realicen los procedimientos respectivos será en cumplimiento a la DIRECTIVA N°001-2019-MTC/20.

4) Deductivos: A la fecha no existe deductivos.

5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos, DME del expediente.

6) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

7) Adicionales de Obras: A la fecha no existe adicionales; pero se aprecia en cuaderno de obra con Asiento N° 769 (del supervisor): Necesidad de ejecutar Prestación de Adicional de Obra según Art. 175 del RLCE – Muros de Contención Variante.

8) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo; el ingeniero de suelos y pavimentos, el ingeniero de Control de Calidad Opción Vial esta y el ingeniero especialista en seguridad se encuentra liquidados por la empresa contratista según refiere el área de RR.HH; por tal motivo se recomienda a Provias Nacional pronunciarse.

Por otra parte, el Especialista Ing. de Producción, Especialista Ambiental (Responsable de implementación del PMA) y el Administrador de Contrato de Obra se encuentran de bajada, asimismo, se apreció en oficina al Ing. Juan Carlos Castro Paz (Reemplazo del Ing. Phun) Ing. en Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos) (con OFICIO N°148-2020-MTC/20.22.2 de fecha 28 de febrero se aprueba el cambio del Ing. Juan Carlos Castro Paz); el personal técnico debe coordinar realizar las actividades de control de calidad en coordinación con la supervisión para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programados.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos, es necesario que el contratista realice mantenimientos de sus equipos y maquinarias.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; el especialista de obras de arte y el Especialista Legal en Liberación de Predios se encuentran de bajada; así mismo el personal técnico debe coordinar realizar las actividades de control de calidad en coordinación con el contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programados.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter así mismo realizar los mantenimientos de las unidades de transporte del personal; por otra parte, se aprecia que supervisión no hace uso constante de su laboratorio.

9) Incidentes: Ninguno.

10) PACRI: los especialistas siguen haciendo coordinaciones para liberar las interferencias con las propiedades de la minera Buenaventura, además el especialista pone en conocimiento que, la minera Buenaventura libero el tramo km 159+680 – km 159+780 reubicado las tuberías.

Por otro lado, los trabajos de colocación de la cama de apoyo, relleno y compactación. respectivo de en la Ramal fueron observados por el ingeniero especialista PACRI; además, el contratista hace referencia en el cuaderno de obra que, Asiento N° 764 (del contratista): por los trabajos de Reubicación de la línea de conducción del sistema de agua potable de Oyon (plazo de ejecución de 120 días calendarios) y de no existir una recepción formal de la obra que se viene ejecutando en la ramal, el consorcio Vial Ambo se abstendrá de ingresar y ejecutar trabajos en las progresivas comprendidas entre el Km 137+144 al Km 142+165 de la obra.

11) Arqueología: Además, PACRI, puso en conocimiento en estos presentes días se apersonarán personal de arqueología de Provias Nacional, para evaluar algunas interferencias sobre arqueología.

Las interferencias arqueológicas 12 de las pendientes por liberación, quedando 02 interferencias ameritan rescate:

Queda pendiente 2 sectores de rescate:

-El camino prehispánico "Paccha" entre las progresiva Km 135+285 al Km 135+390.

-El camino prehispánico "Cuchigaran" entre las progresiva Km 137+015 al Km 137+040.

12) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos preliminares (véase las fotos de los frentes ejecutándose).



- Obras de arte y drenaje (véase las fotos de los frentes ejecutándose).
- Movimiento de tierras (véase las fotos de los frentes ejecutándose).
- Pavimento rígido realizadas del Km 139+220 - Km 139+360 (véase las fotos de los frentes ejecutándose), pero es necesario mencionar y poner en conocimiento que estas actividades a la fecha están siendo observadas por control de calidad de la supervisión, en el tema del acabado "textura" y entre otros controles de calidad.
- Supervisión está denegando autorizaciones para la realización de colocación de concreto, pavimento rígido entre otros en la progresiva Km 152+800 -, Km 181+000, se recomienda detallar el sustento de técnico por el cual fue denegado.
- Con OFICIO N°148-2020-MTC/20.22.2 de fecha 28 de febrero se aprueba el cambio del Ing. Juan Carlos Castro Paz en remplazo del José Enrique Phun Llap Ing. en Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos).

#### Recomendaciones:

- Se recomienda al "Consorcio Vial Ambo" mejorar la logística en toda la obra.
- Se recomienda a la contratista realizar coordinaciones con la concretara UNICON y supervisión con respecto al concreto para el pavimento rígido.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos y cuaderno de obra en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.
- Se recomienda al Contratista acatar las disposiciones efectuadas por la entidad en referencia a los especialistas ofertados; y si de continuar con las acciones de desacato por parte del contratista, se recomienda a la entidad una pronta intervención a fin de continuar con la obra.
- Se recomienda a la Municipalidad de Oyon por medio de Provias Nacional, realizar mayor supervisión de los trabajos de Geoclass, asimismo, renovar los certificados y/o correspondientes (Opinión vinculante vencida) para la explotación de la cantera Rupay y Yanamayo, a fin de evitar problemas futuros (cabe mencionar que según expediente técnico la Municipalidad de Oyon es quien otorga la licencia de explotación del material), además un mayor control de las actividades realizadas en el ramal.
- Se recomienda a Supervisión recepcionar, evaluar los documentos (control de calidad y demás firmadas bajo la responsabilidad del residente de obra) que presenta el contratista y proceder con sus respectivos tramites, así mismo evaluar si existe alguna penalidad según el contrato y TDRs del contratista.
- Se recomienda a la entidad informar al monitor sobre las visitas de los especialistas de Provias Nacional para hacer las respectivas coordinaciones de las actividades en campo.
- Se recomienda detallar el sustento de técnico por parte de los especialistas de control de calidad de supervisión por el cual "no autoriza" las actividades de concreto, pavimento rígido entre otros en la progresiva Km 152+800 -, Km 181+000.

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR


**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
CAMIONETA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

**Foto1:**

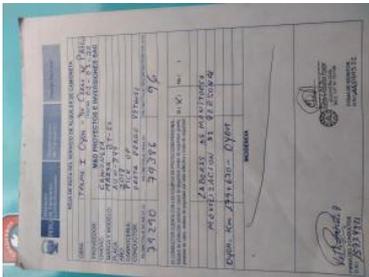

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
ALCANTARILLA CON PRESENCIA DE SATURACIÓN KM 160+906

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
PERSONAL: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-03-2020

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 161+000.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 2 VIGÍAS, 3 OPERADORES.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-03-2020

**Actividades:**

MEJORAMIENTO DE SUELO KM 173+600 \_ KM 173+760.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 1 TÉCNICO Y 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS, 1 OFICIAL, 5 OPERADORES.

MAQUINARIAS. 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO, 3 VOLQUETES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-03-2020

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
RELLENO Y COMPACTACIÓN ALCANTARILLA KM 173+480.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 1 TÉCNICO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 4 OPERARIOS, 1 OPERADOR.  
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 RETROEXCAVADORA, 2 COMPACTADORAS TIPO PLANCHA.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO DE SUELO KM 171+870 KM 172+000, LI.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 PERSONAL: 2 OPERARIOS, 2 VIGÍAS, 4 OPERARIOS.  
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-03-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
 LIMPIEZA Y ENCOFRADO PARA SOLADO DE ALCANTARILLA TMC 48 KM 170+559.18

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 PERSONAL: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIOS, 4 OFICIALES, 1 OPERADOR.  
 MAQUINARIAS: 1 MINICARGADOR.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-03-2020

**Actividades:**

CONTROL TOPOGRÁFICO DE MEJORAMIENTO DE SUELO KM169+450\_ KM  
169+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 2 TOPOGRAFO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE  
TOPOGRAFÍA (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA).  
EQUIPOS: 1 ESTACIÓN TOTAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-03-2020

8



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO DE SUELO KM 169+450\_ KM 169+900 LI

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 PERSONAL: 2 TOPOGRAFO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA).  
 EQUIPOS: 1 ESTACIÓN TOTAL.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-03-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 162+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 PERSONAL: 2 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 1 .  
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.3 VOLQUETES.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
PERFORACIÓN Y EXCAVACIÓN KM 169+780.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 EXCAVADORA MARTILLO, 2 VOLQUETES.

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
VACIADO MURO KM 162+660 SUPERVISOR CESEL.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL: 1 INGENIERO SUPERVISOR DE CESEL, 1 CAPATAZ, 17 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADOR, 1 TÉCNICO Y 2 AUXILIARES DE CONTROL TOPOGRÁFICO DE CVO.  
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 MIXER, 1 VIBRADOR PARA EL CONCRETO, 1 ESTACIÓN TOTAL.

12

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
PERFORACIÓN KM 162+380.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA MARTILLO

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
VOLADURA KM 162+350 (TRABAJOS DE LA VARIANTE II).

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD DE CVO, 7 PERSONAL TÉCNICO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM161+170.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
02-03-2020

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 161+000.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS,  
MAQUINARIA: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-03-2020

**Actividades:**

RELLENO Y COMPACTACIÓN ALCANTARILLA MC KM 160+640

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 3 OPERADORES, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 VIBROAPISONADOR.

17

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
RELLENO Y COMPACTACIÓN ALCANTARILLA MC KM 154+545.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 3 OPERADORES, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 VIBROAPISONADOR. 1 RETROEXCAVATORA,

18

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-03-2020

**Actividades:**

RELLENO Y COMPACTACIÓN (CAPA 5 ) ALCANTARILLA KM 153+709.40

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 3 OPERADORES, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 VIBROAPISONADOR.

19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
ENCOFRADO Y RELLENO KM 151+253.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL: 3 OPERADORES, 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 1 TOPOGRAFO.  
EQUIPOS Y MÁQUINARIAS: 2 VIBROAPISONADOR.

20

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-03-2020

**Actividades:**  
PAVIMENTO RÍGIDO KM 139+210 KM 139+310

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 2 INGENIEROS DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 16 PERSONAL DE PISO, TOPOGRAFOS Y AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA ), 3 OPERADORES, INGENIERO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
MAQUINARIAS: 1 PAVIMENTADORA, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 3 VOLQUETES.

21

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-03-2020



**Fotos:**
