



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 1	<b>Fecha Informe:</b> 09-12-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir las copias que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

Se está revisando la información de la ejecución contractual para confirmar.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

No se presenta.

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó en campo señalización ambiental y colocación de baños portátiles tipo DISAL.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Se reitera lo informado en el panel fotográfico N°02 de fecha 09-12-2020

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

A la fecha no se cuenta con unidad vehicular que debería contratar Provias Nacional para el traslado del Monitor de Obra en la extensión de la obra. Se está tratando de coordinar con la Supervisión para acompañarlos en alguna de sus camionetas.



**Recomendaciones:**

Se recomienda dar prioridad para la contratación de la unidad vehicular para el traslado del Monitor de Obra de Provias Nacional para que pueda realizar eficazmente el servicio de seguimiento y monitoreo de la obra asignada.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
09-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**  
10-12-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b> MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 09-12-2020
--	----------------------------	---

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+090 AL KM 77+500  
TRABAJOS DE PEDRAPLENES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CON UN PROFESIONAL RESPONSABLE, TRES TRABAJADORES, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y CINCO CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LA CANTERA LOCALIZADA EN EL KM 83+700.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-12-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

09-12-2020

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 83+470 AL KM 83+590  
TRABAJOS DE PEDRAPLENES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE VISUALIZÓ LA REUNIÓN EN CAMPO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA, POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE OGROPUQUIO, AUTORIDADES LOCALES Y FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA) PARA EVALUAR EL RECLAMO DE LOS POBLADORES RESPECTO A LA SUPUESTA AFECTACIÓN DE SUS FUENTES DE AGUA LOCALIZADO DENTRO DEL SECTOR DEL KM 83+470 AL KM 83+590. DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE EVALUACIÓN EN CAMPO, SE CULMINÓ CON LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA CON EL CUAL LOS FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA) IBAN A PRONUNCIARSE SEGÚN SUS PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

2


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

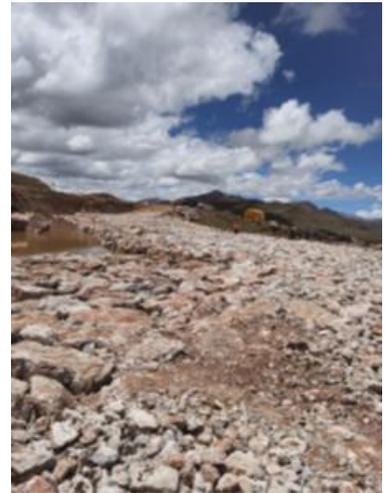

**Fecha Toma De Datos:**

09-12-2020
