

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	33	15-01-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la necesidad de un adicional de obra.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se trasladan los excedentes de materiales provenientes de los cortes y/o excavaciones a los DMEs

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Se está revisando la información contractual para su evaluación. Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales.

**8) INCIDENTES:**

Sin Comentario.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

**Recomendaciones:**

Se recomienda solicitar reuniones mediante las plataformas virtuales con las empresas de Supervisión y Contratista para que sustenten sus estrategias y planificaciones para la ejecución de trabajos en la temporada de estación climatológica con lluvias en la zona de trabajo propia de la región altoandina.

**Auditoria Fecha De Creación:**

15-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-01-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+880  
ENCOFRADO Y DEENCOFRADO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+880, CON LA PARTICIPACIÓN DE CINCO TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS.

1


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

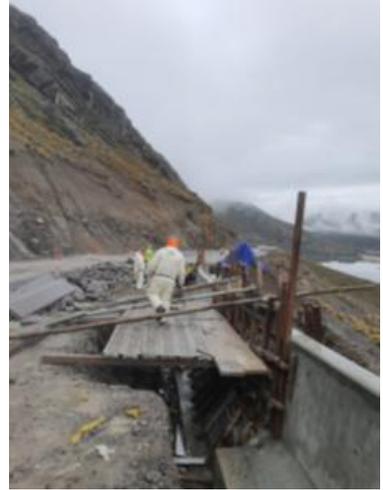

**Fecha Toma De Datos:**  
15-01-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER  
FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-01-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+400 AL KM 39+490  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+400 AL KM 39+490, CON LA PARTICIPACIÓN DE DOCE TRABAJADORES, UN CAPATAZ Y VIGIA, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ENCOFRADO.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+990  
MURO DE CONCRETO ARMADO


**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS EMPOZADAS EN EL MURO DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+990, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN TRABAJADOR, Y UN EQUIPO MECÁNICO DE BOMBEO.

3

**Foto1:**



**Foto2:**

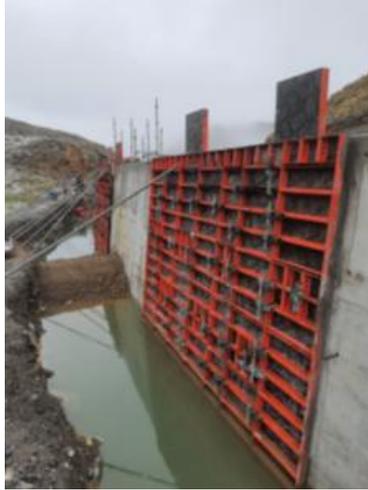

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 47+360  
ALCANTARILLA MARCO MCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA MARCO MCA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 47+360 CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+000 AL KM 54+400  
SUBDREN PROFUNDO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+000 AL KM 54+400, CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACION CON TRES TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UNA RETROEXCAVADORA Y DOS EXCAVADORAS CON SUS OPERARIOS

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+000 AL KM 73+000  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+000 AL KM 73+000 CON DOS PEONES, UN RESPONSABLE, UNA MOTONIVELADORA, UN CARGADOR FRONTAL Y UN RODILLO CON SUS OPERARIOS Y TRES VIGIAS.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-01-2021
