



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 027	Fecha Informe: 04-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Nro DE INFORME 027

REPORTE DEL JUEVES 04 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 03 OPERARIOS. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

EL MANTENIMIENTO DE VIA DEBE ENFOCARSE OTRA VEZ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 90 AL KM 153.50 YA QUE SE TIENE MAYOR TRANSITO VEHICULAR.

Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

UBICACION: KM 84+400

PARQUE INDUSTRIAL, PROTECCION DE MATERIAL DE CONTAMINACION DE POLVO.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 03 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01
CAMION CISTERNA AGUA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:

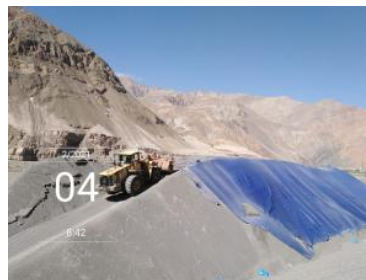

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

UBICACION: KM 86+935

CDescripcion_____:

DESATORO DE BUZON Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 87+400

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE VIA: ELIMINACION DE MATERIAL DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

3
