


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**


BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	6	04-02-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Taucu-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Taucu- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

INFORME DIARIO N°06

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

• Asiento N° 418, con fecha 02/02/2021 (de la Supervisión):

o Con CARTA N° 2510019-CG-21-0080 de la fecha 28.01.21, la supervisión solicita la información del área auxiliar DME – Huachaspina.

o Con CARTA N° 2510019-CG-21-0082 de la fecha 29.01.21, la supervisión da respuesta a la consulta de observaciones en los pases provisionales previa para la ejecución de los puentes Huandocodia KM 34+352 y LLactabamba KM 11+531.

o Con CARTA N° 2510019-CG-21-0088 de la fecha 29.01.21, la supervisión solicita la Data actualizada de afectaciones prediales a la Oficina PACRI CABANA.

o Con CARTA N° 2510019-CG-21-0086 de la fecha 29.01.21, la supervisión pone en conocimiento del contratista la Evaluación al Estado actual de gestión de nuevas Áreas Auxiliares.

• Asiento N° 419, con fecha 03/02/2021 (de la Supervisión): Con CARTA N° 2510019-CG-21-0095 de la fecha 02.02.21, se hace la reiteración de consulta a la entidad sobre el Mejoramiento Geométrico de los 10 segmentos asignados en el Plan de monitoreo Arqueológico PMA.

2) Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.

3) Deductivos: A la fecha no existe deductivos.

4) Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs.

5) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

6) Adicionales de Obras:

• Con CARTA N° 2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presento el Levantamiento de Observaciones N° 03 del Adicional N° 01.

• Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional de obra N° 02.

7) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo, se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía, Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19), especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos (Bajada – Tiempo Parcial), especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales (Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.

8) Incidentes: El día 02.02.2021 se me brindó una información errónea sobre el nombre del contagiado con COVID-19; el contagiado que ante la prueba con hisopado y salió positivo es el Sr. Abel Luis Torres Álvarez (chofer), actualmente se encuentra aislado en distrito de Tauca con constante supervisión del personal de salud; además realizaran una cuarentena el personal que estuvo en contacto directo con el contagiado como: Dalila Castilla de la Cruz (administradora), Wilder Roy Barzola Rojas (chofer n°1), John Eulogio Roldán Minaya (topógrafo N°1), Andrés Carbajal García (auxiliar de topografía N°1) y Manuel Abelardo Reyes Pantoja (auxiliar de topografía N°6).

Asimismo, hoy 04.02.2021 la Lic. Marita Vergaray me informa, al realizar protocolos y las respectivas pruebas para la reincorporación de los personales (que en su momento habían sido puesto en cuarentena parcial por el caso presentado el 02.02.2021); el Sr. Gad Jhonatan López León (Chofer N° 3) salió positivo al COVID-19,

9) PACRI:



?Hoy 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).

?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la Oficina PACRI-CABANA.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.

11)Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Excavación para muro de concreto armado ubicado en el KM 37+300.

?Vaciado de solado y disposición de acero de muro KM 36+275 - KM 36+315.

?Solaqueado de alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el KM 25+790, 28+254.33.

?Encofrado de cabezales de entrada y salida de alcantarilla TMC Ø 36" ubicada en el km 21+370.

?Vaciado de relleno lateral de caja receptora de alcantarilla TMC Ø 36" km 5+678.72.

?Armado de alcantarilla TMC Ø 48" y encofrado de muro de C°A° ubicado en el KM25+095.

•Movimientos de tierras.

•Borde débil por falla geológica KM 34+535 – KM 34+655.

•Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional de obra N° 02.

•CARTA N° 2510019-CG-21-0103 de fecha 04.02.2021 la supervisión presenta la entidad la Valorización de obra N° 11 correspondiente al mes de enero del 2021.

•Con CARTA N° 2510019-CG-21-00105 de fecha 04.02.2021 la supervisión presenta la entidad el Estado situacional de Cantera Dv. Llipo en el mes de enero 2021.

Recomendaciones:

•Se recomienda al "Consortio ICC" mejorar la logística en toda la obra.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SAC" que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SAC" y al contratista "Consortio ICC" cumplir con los lineamientos del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.

•Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SAC" que, ante los dos casos positivos registrados en obra a la fecha, tome medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – cov 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA, así mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla, mascarillas, etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal.

Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****04-02-2021****Actividades:****CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.****CDescripcion_____:**

- LA LICENCIADA EN ENFERMERIA MARITA VERGARAY VIVAR REALIZA CONTROL DE LA TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINSA.

- TERMOMETRO

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****04-02-2021****1**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

04-02-2021

Actividades:

BORDE DEBILITADO KM34+535_ KM 34+655.

CDescripcion_____:

BORDE DEBILITADO POR FALLA GEOTECNICA UBICADO EN EL KM34+535_ KM 34+655

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

TRIAJE REALIZADO POR LA LIC. MARITA VERGARAY ENFERMERA DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_____:

TRIAJE AL PERSONAL QUE SE REINCORPORA A LA OBRA KEVIN ESPINOZA- NIVELADOR N°2

NOTA: ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL PERSONAL EN MENCIÓN TUVO DESCANSO MEDICO POR COVID-19, YA DADO DE ALTA SE REINCORPORA A OBRA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

3

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VIAS KM 22+430_ KM 22+540

CDescripcion_____:PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR, 1 PEON.
MAQUINARIAS UY EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 2 RADIOS
HERRAMIENTAS MANUALES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

04-02-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

- EXCAVACIÓN PARA MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+300.
- REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN LIGERA (DPL).

CDescripcion_____:

PERSONAL: 2 TÉCNICOS DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 OFICIAL, 3 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGIAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPO: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS, EQUIPO DE DPL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

TUBERIA 8" DE AGUA POTABLE KM 36+900 - KM 36+940.

CDescripcion_____:

SE APRECIA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 8" DESCUBIERTO, YA QUE EN ESE TRAMO EL TALUD DESCENDIO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: CAMION DE BOMBA DE VACIO PARA SANITARIOS PORTATILES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****04-02-2021****Actividades:****MANTENIMIENTO DE VIA DEL KM 14+700- KM 14+900.****CDescripcion_____:****PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR, 1 PEON.
MAQUINARIAS UY EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 2 RADIOS
HERRAMIENTAS MANUALES.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****04-02-2021**

8

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****04-02-2021****Actividades:****PACRI DE SUPERVISIÓN Y PACRI DE PVN: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA (7DÍAS)****CDescripcion_____:****PACRI DE SUPERVISIÓN Y PACRI DE PVN: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA (7DÍAS)****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****04-02-2021****9**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PACRI DE SUPERVISIÓN Y PACRI DE PVN: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA (7DÍAS)

CDescripcion_____:

PACRI DE SUPERVISIÓN Y PACRI DE PVN: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA (7DÍAS)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

11

Foto1:



Foto2:

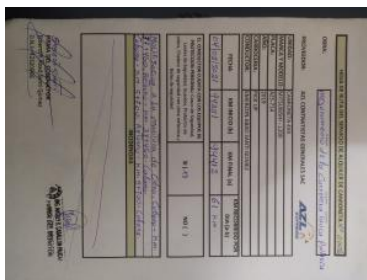


Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:
