


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 8	Fecha Informe: 06-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

INFORME DIARIO N°08

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

- El contratista se encuentra relleno.

2) Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.

3) Deductivos: Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al Adicional N°02.

4) Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs.

5) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

6) Adicionales de Obras:

- Con CARTA N° 2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presento el Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.

- Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional de obra N° 02.

- Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al Adicional N°02.

- Con CARTA N° 2510019-CG-21-0112 de fecha 05/05/2021 la supervisión presentó a la entidad Incidente – Accidente en Obra.

7) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo, se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía, Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19), especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos (Bajada – Tiempo Parcial), especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales (Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.

8) Incidentes: El día 02.02.2021 se me brindó una información errónea sobre el nombre del contagiado con COVID-19; el contagiado que ante la prueba con hisopado y salió positivo es el Sr. Abel Luis Torres Álvarez (chofer), actualmente se encuentra aislado en distrito de Tauca con constante supervisión del personal de salud; además realizaron una cuarentena el personal que estuvo en contacto directo con el contagiado como: Dalila Castilla de la Cruz (administradora), Wilder Roy Barzola Rojas (chofer n°1), John Eulogio Roldán Minaya (topógrafo N°1), Andrés Carbajal García (auxiliar de topografía N°1) y Manuel Abelardo Reyes Pantoja (auxiliar de topografía N°6).

El 04.02.2021 la Lic. Marita Vergaray me informa, al realizar protocolos y las respectivas pruebas para la reincorporación de los personales (que en su momento habían sido puesto en cuarentena parcial por el caso presentado el 02.02.2021); el Sr. Gad Jhonatan López León (Chofer N° 3) salió positivo al COVID-19.

Ayer 05.02.2021 a horas 9:45 am ocurrió un accidente de tránsito en el KM 38+340 - KM 38+360, de la unidad de transporte del personal de laboratorio de supervisión (combi de placa ANQ-252); relación del personal que se encontraba dentro de la unidad: Amador Guillermo Gamarra (jefe de laboratorio, condición de salud muy grave), Herbert Edison Rodríguez Mejía (Téc. Laboratorio N° 1, Condición De Salud Grave), Teófilo Culqui Santillan (controlador de suelos N°1, condición de salud grave), Edgar Salvatierra Lindo (chofer condición de salud grave).

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Hoy 06.02.2021 a horas 3.15 pm se constituyeron la fiscalía policial de Pallasca para realizar la Constatación de Policial del accidente/ incidente ocurrido ayer 05.02.2021 en el km 38+360; quien presidió la Constatación policial fue el Oficial M. Baltazar (unidad policial de Pallasca); a horas 5:15pm se firmo el Acta de Constatación Policial por los siguientes: De la Supervisión: Ing. Rubino Cruz Leon (Espec. Seguridad), Abog. Paquita Elizabeth Soberon Romero (Espec. Legal En Liberación De Predios). Del Contratista: Ing. William Gamarra (Residente De Obra), Ing. Isacc Sanchez Farro (Espec. Seguridad).

En resumen del Acta de Constatación Policial leída por el oficial M. Baltazar hace en mención lo siguiente: Se aprecia que el ancho de calzada es de 3.80 m, con cuneta de 0.90 m, visibilidad, vía en ese tramo solo un sentido, carretera afirmada con moderados agujeros, señalización en a 17 metros al sur se aprecia una señal preventiva recién colocada, a 54 metros postes de madera (cachacos) ya estaban situados.

9)PACRI:

?El 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).

?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la Oficina PACRI-CABANA.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.

11)Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Excavación para muro de concreto armado ubicado en el KM 37+300, .

?Encofrado del paño N° 5 y disposición del acero en el paño N°6 del muro de C°A° ubicado en el KM 36+275 - KM 36+315.

?Limpieza de cabezal de entrada de la alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el KM 24+900.

?Solaqueado de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el KM 28+748.10.

?Encofrado de muro de C°A° para alcantarilla alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el KM 25+096.44.

?Vaciado de la caja de salida de la alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el KM 21+940.

?Mantenimiento vial del km 25+200 – km 25+300.

•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0106 de fecha 05.02.2021 la supervisión presenta la entidad la Valorización de Obra N°06 correspondiente por Costos Incurridos Debido a la Implementación de las Medidas para Prevención y Control a la Propagación del Covid-19.

•Con CARTA N° 087-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 05/02/2021, el contratista presenta a la supervisión Reporte Flash de Incidente/ Accidente.

•Se aprecio a un personal de supervisión (administrador) contagiado por Covid-19 afueras de sus instalaciones de cuarentena y/o aislamiento; el mismo hoy 06.02.2021 personal (administradora) estuvo en las instalaciones de la supervisión quien refiere que salió para realizar trámites (Policiales) con urgencia por el accidente suscitado el día de ayer 05.02.2021.



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” y al contratista “Consortio ICC” cumplir con los lineamientos del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, ante los dos casos positivos registrados en obra a la fecha, tome medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA, así mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla, mascarillas, etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad, se recomienda a la supervisión, tomar medidas estrictas en hacer cumplir esta.
- Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo el tramo.

Auditoria Fecha De Creación:

06-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD INSPECCIONADO LOS HECHOS DEL
ACCIDENTE**CDescripcion_____:**

ING. RUBINO DE SUPERVISIÓN Y ING. VERA DEL CONSORCIO

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARÁ MURO C°A° KM 37+300

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERARIO

EQUIPOS Y RRE1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS

SE SE PUEDE APEECIAR QUE AHORAS 9:54AM LA MÁQUINA ESTA SIN ACTIVIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-02-2021

Actividades:
 ENCOFRADO PARA ZAPATA PAÑO N°5

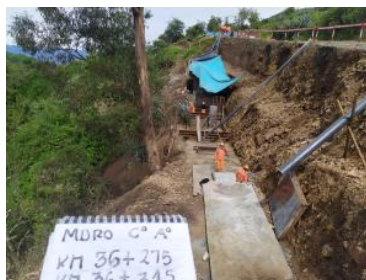
CDescripcion _____:

PERSONAL: 1CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERARIO, 2 PEONES.
 HERRAMIENTAS MANUALES-

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-02-2021

Actividades:
 DISPOSICIÓN DE ACERO DE ZAPATA PAÑO N° 6 UBICADA EN EL KM 36+275 _ KM 36+317.

CDescripcion _____:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS, 3 PEONES.
 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**
Nivel:
No Aplica
Fecha De Fotografia:
06-02-2021
Actividades:
**SOLAQUEADO DE CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC 36"
KM 28+748.10**
CDescripcion_____:
**PERSONAL: 1 OPERARIO, 1 OFICIAL
HERRAMIENTAS MANUALES**
Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**
Nivel:
No Aplica
Fecha De Fotografia:
06-02-2021
Actividades:
**CONTROL DE NIVELES DEL ENCOFRADO DE MURO PARA ALCANTARILLA TMC
36\"/>**
CDescripcion_____:
PERSONAL: 1 TOPOGRAFO, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 4 CARPINTEROS.
Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL DEL KM 25+200 _KM 25+300.

CDescripcion_____:PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 PEONES, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: CARGADOR FRONTAL**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

-VACIADO DE CONCRETO DE ALERO DE SALIDA ALCANTARILLA TMC 36 KM 21+940.

-VIBRADO DE CONCRETO

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN, 2AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN)Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 OFICIALES, 2 OPERARIO, 3 PEONES.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 21+940

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERARIO, 1 OFICIAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE AREAS LATERALES DEL CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC 36" UBICADO EN EL KM 24+900.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERARIO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES DE PISO, VIGIAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

TOMA DE MUESTRAS DE BRIQUETAS DEL CONCRETO F'C175 KG/ CM2 DEL VACIADO DEL ALERO DE LA ZAPATA DE LA ALCANTARILLA TMC 36" UBICADOS EN EL KM 21+940.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA).
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: BRIQUETAS, TERMÓMETRO.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021 EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG. PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS).

DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021
EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO
DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG.
PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE
PREDIOS).DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC
SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE
SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021
EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO
DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG.
PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE
PREDIOS).DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC
SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE
SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021
EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO
DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG.
PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE
PREDIOS).DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC
SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE
SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021
EN EL KM 38+340 - KM38+360.- CONSTATCIÓN AL PUNTO FINAL DONDE SE ENCUENTRA EL VEHICULO
(APROX. 75 METROS).

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO
DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG.
PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE
PREDIOS).DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC
SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE
SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021 EN EL KM 38+340 - KM38+360.

- CONSTATACIÓN AL PUNTO FINAL DONDE SE ENCUENTRA EL VEHICULO (APROX. 75 METROS).

CDescripcion_____:

CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG. PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS).

DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

FIRMA DE ACTA DE CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021 EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

FIRMADA POR:

- OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).
- DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG. PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS).

- DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

- DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA).

DEL ACTA: SE APRCIA QUE EL ANCHO DE CALZADA ES DE 3.80 M CON CUNETETA DE 0.90 M, VISIBILIDAD, VIA EN ESE TRAMO SOLO UN SENTIDO, CARRETERA AFIRMADA CON MODERADOS AGUJEROS, SEÑALIZACIÓN EN A 17 METROS AL SUR SE APRECIA UNA SEÑAL PREVENTIVA RECIEN COLOCADA, A 54 METROS POSTES DE MADERA (CACHACOS).

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

CONSTATACIÓN POLICIAL DEL ACCIENTE OCURRIDO EL DÍA DE AYER 05.02.2021
EN EL KM 38+340 - KM38+360.

CDescripcion_____:

- CONSTATACIÓN AL PUNTO FINAL DONDE SE ENCUENTRA EL VEHICULO
(APROX. 75 METROS).CONSTATACIÓN POLICIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05.02.2021 A CARGO
DEL OFICIAL M. BALTAZAR (UNIDAD POLICIAL DE PALLASCA).

PERSONAL:

DE LA SUPERVISIÓN: ING. RUBINO CRUZ LEON (ESPEC. SEGURIDAD), ABOG.
PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO (ESPEC. LEGAL EN LIBERACIÓN DE
PREDIOS).DEL CONTRATISTA: ING. WILLIAM GAMARRA (RESIDENTE DE OBRA), ING. ISACC
SANCHEZ FARRO (ESPC. SEGURIDAD).

DE LA ENTIDAD: ING. NATALY SUSI CABALLON PAUCAR (MONITORA DE OBRA)

-NOTA: AYER 05.02.2021 NO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN POLICIAL YA QUE
SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL DE MAYOR INTENSIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:
