



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	53	08-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha informado a la Entidad su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y se informa la Aprobación del Cambio del Jefe de Supervisión con el Ing. Miguel Martínez Huaman y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

08-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+780
MARCO DE CAJA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE MARCO DE CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+780 CON TRES TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS.

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:

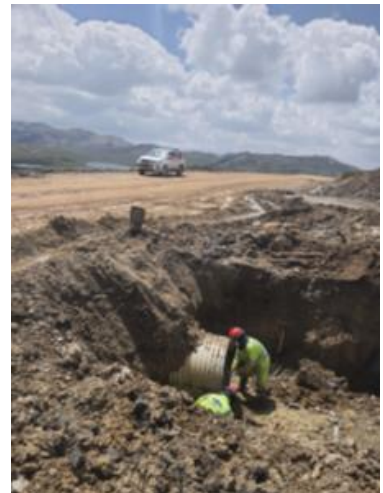

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145 AL KM 70+181
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145 AL KM 70+181 CON LA PARTICIPACIÓN DE SIETE TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UN VIBRADOR, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, UN CARMIX Y DOS VIGIAS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180
ENCOFRADO PARA MARCO DE CAJA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA
METALICA CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE MARCO DE CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180 CON TRES
TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
CON CUATRO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA**CDescripcion**_____:SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 75+282 CON SIETE TRABAJADORES, UNA EXCAVADORA
CON SU OPERARIO.

5

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+200 al Km 84+300
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+200 al Km 84+300, CON LA PARTICIPACION DE UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SUS OPERADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
