



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 030	Fecha Informe: 08-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

Nro INFORME 030

REPORTE DEL LUNES 08 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

El día de ayer domingo se tuvo fuerte precipitación pluvial, por lo que se evidencia daños en la vía desde el km 130 al km 153, como desprendimiento de roca y lodo en gran parte de la plataforma en diferentes tramos, como se puede apreciar en el panel fotográfico.

Así también hoy se tuvo una fuerte precipitación pluvial (torrencial y tormenta eléctrica) en horas de la tarde (2:30 pm aprox.) desde el km 55+000 al km 74+800 (Puente el Chorro II) activándose quebradas en diferentes lugares colapsando alcantarillas y produciéndose huaycos de ceniza y lodo sobre todo en la progresiva km 68+900 impidiendo el paso vehicular como se aprecia en el panel fotográfico.

El tramo crítico del km 74+000 al km 74+800 talud de corte muy inestable, se produjo caída de rocas y lodo, dañando la camioneta de alquiler en la parte posterior derecha con abolladuras por impacto de piedras.

Se comunico de estos eventos a la Supervisión, para que coordine con el Consorcio Contratista para que tomen las acciones inmediatas que amerita dar transitabilidad y seguridad a la vía.

Recomendaciones:


Desde el día de ayer domingo se presentan fuertes precipitaciones pluviales, por lo que la cuadrilla de contingencia del Consorcio Contratista debe abastecer en la atención de emergencias que podrían producirse.

Auditoria Fecha De Creación:

08-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación Km 151+900

CDescripcion_____:

Con las lluvias de ayer domingo se tuvo daños en la plataforma

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
 ubicación: progresiva km 150 350

CDescripcion_____:
 Deslizamiento en taludes de corte y arrastre de lodo y piedras en plataforma.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
 Ubicación: progresiva km 150 350

CDescripcion_____:
 Deslizamiento de lodo y piedras, ocasionado por las lluvias del día de ayer domingo 07 de febrero del 2021

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
Ubicación: progresiva km 116+340

CDescripcion_____:

Se tiene roca en plataforma el cual debe ser retirado por el Consorcio Contratista de manera urgente para evitar accidentes de transito que lamentar.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
Ubicación: Puente Amarillo (aprox. km 113+250)

CDescripcion_____:

Se tiene crecida del caudal, no tiene obras de encauzamiento si aumenta el caudal estaría propenso a socavación.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
Ubicación: Km 68+900

CDescripcion_____:
Se activaron quebradas por las lluvias de hoy (aprox. 2:30 pm) no se tiene pase vehicular.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
Ubicación: TMC 36" km 69+099

CDescripcion_____:
Colapso (colmatación) de alcantarillas.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
 Ubicación: TMC de 48" 71+340

CDescripcion_____:
 Colmatación de alcantarillas

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2021

Actividades:
 Ubicación: puente pachas y km 74+500

CDescripcion_____:
 Caída de rocas, daño la camioneta de alquiler de traslado de personal PVN MTC

9

Foto1:



Foto2:

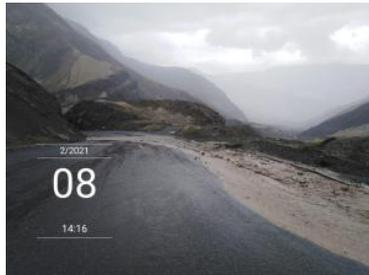


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-02-2021
