

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	55	10-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha informado a la Entidad su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y se informa la Aprobación del Cambio del Jefe de Supervisión con el Ing. Miguel Martínez Huaman y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

10-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 87+115
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____ :
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 87+115 CON DOS TRABAJADORES, UN ENCARGADO, UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+100 al Km 84+200
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+100 al Km 84+200, CON LA PARTICIPACION DE DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SUS OPERADOR.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DEL KM 83+700 LD

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD EN SU ETAPA DE PERFORACIÓN PARA VOLADURA CON OCHO TRABAJADORES, UN TRACK DRILL Y SU OPERADOR.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

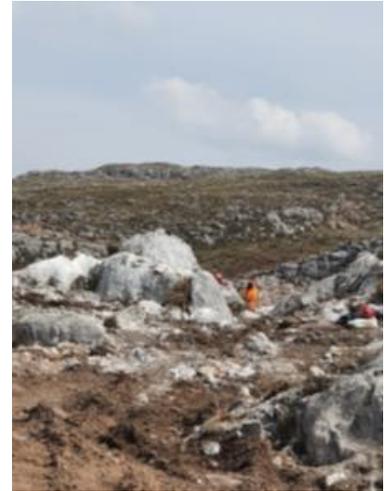

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282 CON DOS TRABAJADORES, UN RODILLO BERMERO CON SU OPERADOR Y UNA VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-02-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+855
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+855 CON DOS TRABAJADORES, UN RESPONSALE, UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERADOR Y DOS VIBROAPISONADORES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+540
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+540 CON CUATRO TRABAJADORES, UN VIGIA, Y CUATRO VIBROAPISONADORES.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+830
ENCOFRADO PARA MARCO DE CAJA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE MARCO DE CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+830 CON DOS TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

7


Foto1:



Foto2:



Foto3:

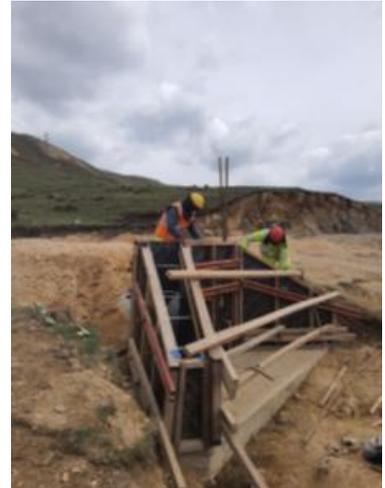

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377 CON CUATRO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145 AL KM 70+181
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO PARA EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145 AL KM 70+181 CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES TRABAJADORES, UN CAPATAZ, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, UN VIGIA.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-02-2021
