

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	57	12-02-2021	Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Hoy no se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra debido a una descoordinación que el suscrito incurrió con el Jefe de Supervisión.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Sin Comentario.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave tanto para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería como para el cargo de Especialista en Puentes, Obras de Arte y Drenaje.

**8) INCIDENTES:**

Sin Comentario.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20.

**Auditoria Fecha De Creación:**

12-02-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

13-02-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 89+680 LD  
MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLENES

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLENES EN EL SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 89+680 LD EN SU ETAPA DE ACOPIO DE MATERIALES CON UN TRABAJADOR, UN VIGIA, UN CARGADOR FRONTAL Y SU OPERADOR.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2021



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-02-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 87+229  
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 87+229 CON DOS TRABAJADORES, UN ENCARGADO, UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR.

2


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

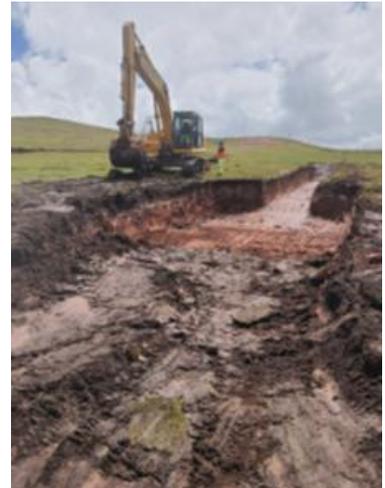

**Fecha Toma De Datos:**

12-02-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500  
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500, CON LA PARTICIPACION DE UN TRABAJADOR, UN VIGIA, UNA EXCAVADORA , TRES CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282  
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282 CON TRES TRABAJADORES, UN RODILLO BERMERO CON SU OPERADOR Y UNA VIGIA.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+810  
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+810 CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS Y UNA EXCAVADORA CON SU OERADOR.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2021
