



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	14	13-02-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Taucá-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Taucá- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:****INFORME DIARIO N°14****Foto Bitacora 6:**



Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

• A la fecha, el cuaderno de obra está registrado hasta el Asiento N° 432, con fecha 12/02/2021 (de la supervisión): referente al asiento N° 430, la supervisión recomienda realizar trabajos necesarios por seguridad y transitabilidad vial.

2) Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.

3) Deductivos: Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al Adicional N°02.

4) Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs. El DME de INACO está en pendiente firma por el Agente Municipal.

5) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando, pero hoy 13.02.2021 se suspendió las actividades, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por COVID-19.

6) Adicionales de Obras:

• Con CARTA N° 2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presento el Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.

• Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional de obra N° 02.

• Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al Adicional N°02.

7) Recursos Ofertados:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo, se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

Es necesario mencionar que el Ing. Freddy Flores Ramos Especialistas de Obras de Arte y Drenaje y el Ing. Giskard Mechan Tola Especialista responsable en Control de Calidad se encuentran de bajada.

Además, el Ing. William Gamarra residente de obra, informó a la supervisión sobre los contagios en el personal de laboratorio y obras de arte (3 casos confirmados) y en personal de campo (2 casos confirmados: 1 vigía y 1 operario), asimismo el día 12.02.2021 la secretaria del residente dio positivo al Covid-19, ante el incremento de casos: hoy 13.02.2021 se suspendieron las actividades, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por SARS-COV-2, así mismo algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en obra) de los cuales resultaron negativos según refiere el Ing. William Gamarra residente de obra, por otra parte, el residente solicito más pruebas en obra los mismos que llegaron el domingo 14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementaran un médico ocupacional para realizar las pruebas a todos los colaboradores faltantes.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.

Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía, Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19), especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos (Bajada – Tiempo Parcial), especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales (Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

Asimismo, el Ing. Henry Saavedra Paredes (Jefe de Supervisión), Ing. Adolfo Salazar Salazar (Especialista de Puentes, Estructuras y Obras de Arte), Ing. Jesús Sanchez Sanchez (Especialista en Control de Calidad), Abog. Paquita E. Soberón Romero (Especialista Legal en Liberaciones de Predios), Lic. Nancy Vera Vásquez (Especialista en Relaciones Comunitarias), Lic. Rosa M. Olivera Miranda (Especialista en Arqueología) están de bajada.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.

Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta



con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3 están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renunció, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.

8) Incidentes:

?Así mismo se apreció una vez más que, el especialista de costos y presupuestos de la supervisión sin mascarilla en las instalaciones (oficinas) de supervisión.

?El día 12.02.2021 la secretaria del residente de obra se realizó su prueba dando positivo al Covid- 19.

?Hoy 13.02.2021 se suspendieron las actividades en toda la obra, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por SARS-COV-2, así mismo el día de hoy algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en obra) el cual los resultados fueron negativos según refiere el Ing. William Gamarra (Residente de Obra), por otra parte, el Residente de Obra solicitó más pruebas en obra los mismos que llegaron el domingo 14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementarán un médico ocupacional para realizar las pruebas a todos los colaboradores faltantes; por ende, las actividades programadas continuarán en su desarrollo.

9) PACRI:

?El 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).

?Se está trabajando en las soluciones de la problemática de las afectaciones en el sector de PUCA, en la afectación de la Iglesia.

?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la Oficina PACRI-CABANA.

?A inicio de mis servicios se recomendó a la oficina de PACRI-CABANA y a PACRI de la supervisión manejar un solo archivo nativo (planos) e uniformizar y/o actualizar datos.

10) Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.

Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Se suspendieron las actividades en toda la obra, se suspendieron las actividades en toda la obra, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por SARS-COV-2, así mismo el día de hoy algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en obra) el cual los resultados fueron negativos según refiere el Ing. William Gamarra (Residente de Obra), por otra parte, el Residente de Obra solicitó más pruebas en obra los mismos que llegaron el domingo 14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementarán un médico ocupacional para realizar las pruebas a todos los colaboradores faltantes; por ende, las actividades programadas continuarán en su desarrollo.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Recomendaciones:**

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA ante el incremento de contagios en los colaboradores; así mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla, mascarillas, etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad esta medida, se recomienda a la supervisión y al contratista, tomar medidas estrictas en hacer cumplirlas.
- Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo el tramo.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo.

Auditoria Fecha De Creación:

13-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA HABILITACIÓN DE ACERO.

CDescripcion_____:SE APRECIA QUE, EN ÁREA DE FIERRERIA UBICADO EN EL KM 42+080 (ACOPIO)
NO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE FIERRERIA PARA LA HABILITACIÓN
DE ACERO.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

13-02-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ACOPIO KM 42+080.

CDescripcion_____:

-SE APRECIA NO ACTIVIDADES EN EL ACOPIO UBICADO EN EL KM 42+080, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARÁN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

MAQUINARIAS PARADAS EN EL ACOPIO KM 42+080

CDescripcion_____:

-SE APRECIA NO ACTIVIDADES EN EL ACOPIO UBICADO EN EL KM 42+080, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARÁN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VÍA TRAMO DE LUGAR DE ACCIDENTE KM 38

CDescripcion_____:

SE APRECIA QUE SE REALIZO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LOS MISMOS QUE FUERON SUSPENDIDOS, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARÁN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1:



Foto2:

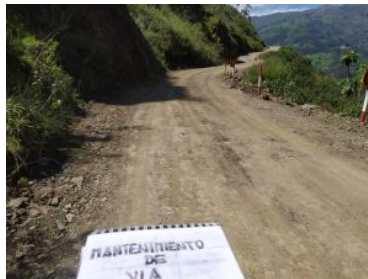


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 36+275_ KM 36+315.

CDescripcion_____:

MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARÁN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARADOS KM 36+275

CDescripcion_____:

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARÁN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EN ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580
- KM 34+610.

CDescripcion_____:

-SE APRECIA UN VIGÍA Y LAS SEÑALES PREVENTIVAS EN TRAMO DE FALLA
GEOLÓGICA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

ACOPIO DE AGREGADO (PIEDRA CHANCADA Y ARENA) UBICADO EN EL KM
20+900 - KM 21+000

CDescripcion_____:

-SE APRECIA PIEDRA CHANCADA Y ARENA GRUESA.
PERSONAL: 1 VIGILANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO ICC.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 3 ENCARGADAS DE LA DESINFECCIÓN ANTI COVID-19.

Foto1:

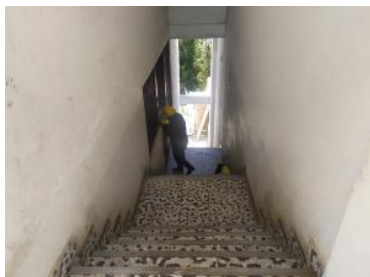


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA DE MONITOREO.

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO EN OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

