



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	59	15-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave tanto para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería como para el cargo de Especialista en Puentes, Obras de Arte y Drenaje.

8) INCIDENTES:

Se efectuó una reunión en las Oficinas de CRBC con la participación del Residente de Obra, Ing. Hugo Ramos Levy y el Jefe de Supervisión, Ing. Miguel Martínez Huaman, para coordinar la gestión del cuaderno de obra y programar una reunión con los ingenieros especialistas.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20.

Auditoria Fecha De Creación:

15-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+200
SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+200 CON TRES TRABAJADORES, UN TOPÓGRAFO Y DOS AYUDANTES Y UN EQUIPO DE RETROEXCAVADORA CON SU OPERADOR.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180
ENCOFRADO PARA MARCO DE CAJA LD DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA
METALICA CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE MARCO DE CAJA LD ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180 CON TRES
TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONCRETO PARA EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN SU COMPONENTE DE PREPARACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131 CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES TRABAJADORES, UN CAPATAZ, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, DOS VIGIAS Y UN CAMION CARMIX CON SU OPERADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
CON CUATRO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+810
RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA
CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+810
CON TRES TRABAJADORES CON SUS EQUIPOS VIBROAPISONADORES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+540
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____ :

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+540 CON DOS TRABAJADORES, AUXILIAR DE LABORATORIO, TECNICO DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CONTROL DE DENSIDAD Y HUMEDAD.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+380
PEDRAPLENES

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES
CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL SECTOR
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+380 CON UN PEON Y UNA EXCAVADORA
CON SU OPERARIO, UTILIZANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS CANTERAS
DEL KM 83+700.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

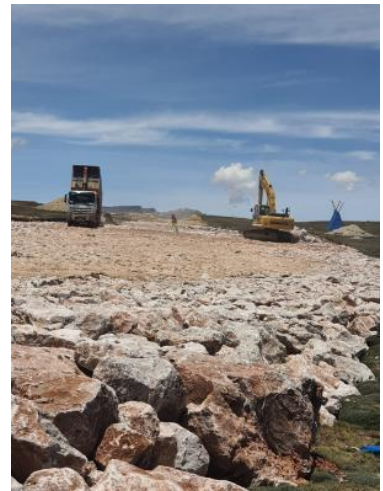

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
