



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 62	Fecha Informe: 18-02-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería.

8) INCIDENTES:

Se están programando reuniones entre especialistas del Contratista y de la Supervisión de Obra para tratar temas de coordinación para aclarar observaciones de los expedientes presentados por el contratista en las especialidades de Obras de Arte y de Metrados y de Valorizaciones.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Se tiene conocimiento de que el área de la Dirección de Obras está solicitando el Estado Situacional de Arqueología de la carretera Canta – Huayllay al área de Derecho de Vía de Provias Nacional.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad.

Auditoria Fecha De Creación:

19-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131
DESENCOFRADO DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
DESENCOFRADO DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131 CON LA PARTICIPACIÓN DE
CUATRO TRABAJADORES Y HERRAMIENTAS, CON UN VIGIA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180
ENCOFRADO PARA MARCO DE CAJA LI DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA
METALICA CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE MARCO DE CAJA LI ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+180 CON DOS
TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

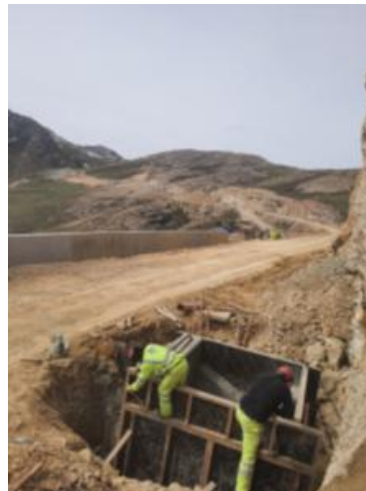

Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
CON CINCO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

3

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+040 AL KM 73+100
CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE CONFORMACION DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM
73+040 AL KM 73+100 CON UN TRABAJADOR CON EQUIPO RODILLO LISO
VIBRATORIO, UN TOPOGRAFO, 4 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA Y DOS VIGIAS.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:


18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+410
RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA
CORRUGADA

CDescripcion _____ :

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+410
CON SEIS TRABAJADORES, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y UN EQUIPO DE
EXCAVADORA Y DOS VIGIAS.

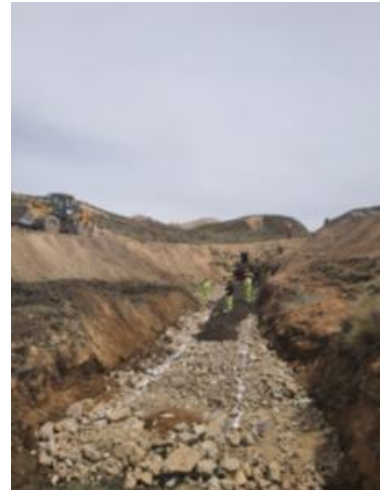Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR DE LA PROGRESIVA DEL KM 82+820 LD
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA DEL SECTOR DEL KM 82+820 LD EN SU COMPONENTE DE PRE CORTE CON VOLADURA CON UN RESPONSABLE, TRES OPERARIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, UN TOPOGRAFO CON SU EQUIPO DE ESTACION TOTAL Y UN AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DEL KM 83+700 LD

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, CINCO CAMIONES VOLQUETES, UN CONTROLADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+800
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS
DEL KM 85+800 CON UN TRABAJADOR, UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS, UN
CARGADOR FRONTAL, CAMIONES VOLQUETES Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO
CON SU OPERADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021
