

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Confir ma Bitaco ra: Si | Nro Inform e: 69 | Fecha Informe: 26-02-2021 | Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:


Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 CON VEINTIDOS TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, DOS VIGIAS Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:

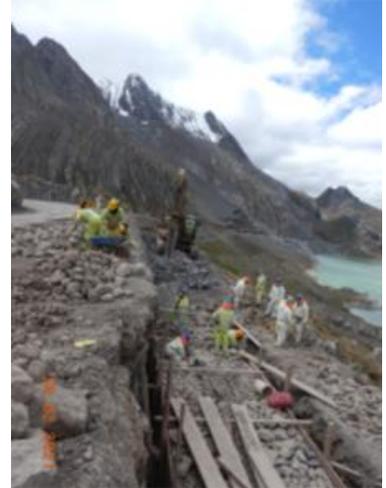

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490, CON LA PARTICIPACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES, UN CAPATAZ, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VIBROAPISONADORES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+040
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+040, CON LA PARTICIPACION DE UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES Y UNA VIGIA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 52+000
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 52+000, CON LA PARTICIPACION DE UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES Y DOS TRABAJADORES Y UN CAPATAZ Y UNA VIGIA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+360
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____ :
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+360 CON UN TRABAJADOR, UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+860
SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+860 CON SEIS TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UN CAMION CISTERNA, UN CARGADOR FRONTAL, UNA RETROEXCAVADORA, UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR Y UNA VIGIA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120
CONCRETO CLASE C 27.4 MPa (F'c= 280 kg/cm²)

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONCRETO EN LA ALCANTARILLA MARCO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120, CON LA PARTICIPACION DE TRES TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS VIBRADOR, CAMION MIXER.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2021

7
