



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	70	27-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Se comenta que la contratista había solicitado una reunión para el día de hoy sábado 27-02-21 en sus oficinas para las 9 am con la participación de los especialistas de Suelos y Pavimentos del Supervisor, sin embargo el personal de la Supervisión no se acercó a dicho recinto en ese horario programado.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Auditoria Fecha De Creación:

27-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO**Nivel:**


No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE OFICINAS DE LA SUPERVISION DE OBRA**CDescripcion**_____:

SE REALIZÓ LA INSPECCION INOPINADA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA, CONSTATANDO SE LA EJECUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS POR EL PLAN COVID – 19, COMO LA DESINFECCION DE CALZADO Y ROPA, LAVADO Y SECADO DE MANOS, TOMA DE LA TEMPERATURA Y PULSO DEL PERSONAL POR UNA PROFESIONAL DE LA SALUD.

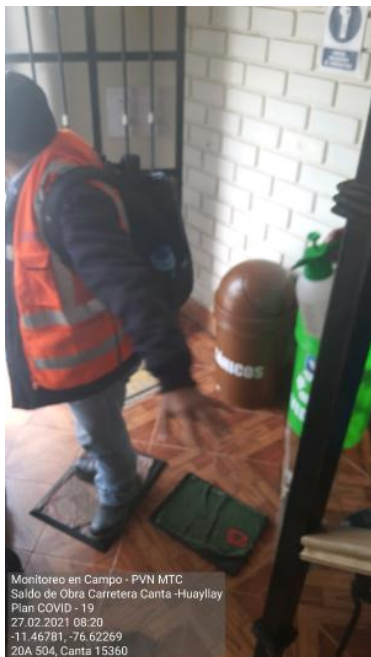Foto1:

Monitoreo en Campo - PVN MTC
Saldo de Obra Carretera Canta -Huayllay
Plan COVID-19
27.02.2021 08:20
-11.46781, -76.62269
20A 504, Canta 15360

Foto2:

Monitoreo en Campo - PVN MTC
Saldo de Obra Carretera Canta -Huayllay
Plan COVID-19
27.02.2021 08:20
-11.46777, -76.62267
20A 504, Canta 15360

Foto3:

Monitoreo en Campo - PVN MTC
Saldo de Obra Carretera Canta -Huayllay
Plan COVID-19
27.02.2021 08:21
-11.46708, -76.62288
Jr. Tarapacá 703, Canta 15360

Fecha Toma De Datos:

27-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

CDescripción_____:

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUPERVISOR REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE CANTERAS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 18+000 AL KM 20+000
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE REPLANTEO PARA LA
UBICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL
KM 18+000 AL KM 20+000 CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALISTAS DE TOPOGRAFÍA Y SEGURIDAD VIAL DE LA SUPERVISION DE
OBRA Y DEL CONTRATISTA CRBC.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****27-02-2021****Actividades:****OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA EN EL AREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS****CDescripcion_____:**

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA SOLICITÓ UNA REUNION EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS ESPECIALIDADES DE SUELOS Y PAVIMENTOS PARA LAS 9:00 am, ACOTANDO QUE ANTE LA FALTA DE PARTICIPACION POR EL ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN GENERÓ UN MALESTAR DE LA CONTRATISTA PORQUE LA SUPERVISIÓN NO CUMPLIO CON EL HORARIO ACORDADO DE LA REUNION PROGRAMADA, DEJANDO CONSTANCIA EN UN ACTA ELABORADO Y SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****27-02-2021**
