



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 87	Fecha Informe: 19-03-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realiza en sectores parciales del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID – 19.

Se tuvo una reunión en campo con un ingeniero representante de la minera VOLCAN, en la cual participaron el Especialista en Seguridad de la Supervisión, Especialistas de Geología y Geotecnia tanto de la Supervisión y Contratista.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

Auditoria Fecha De Creación:

19-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+980
REUNION EN CAMPO CON MINERA VOLCAN

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA REUNIÓN EN CAMPO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA MINERA VOLCAN CON SU REPRESENTANTE ING. MARLON RAMOS Y TAMBIEN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CON LOS ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y GEOLOGIA Y GEOTECNICA Y TECNICOS EN TOPOGRAFIA Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON EL INGENIERO GEOLOGO Y GEOTECNISTA Y SU ASISTENTE. EL MOTIVO FUE CON BASE AL RIESGO DE AFECTACIÓN DE SU TORRE DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIZADA A LAS CERCANIAS DE LA PROGRESIVA DEL KM 71+980. AL RESPECTO LA EMPRESA CONTRATISTA ESTA DISPUESTA A SUSTENTAR QUE SE MANTENDRAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MINERA VOLCAN A PARTIR DE LA SOLICITUD QUE ESTA GENERE.

Foto1:

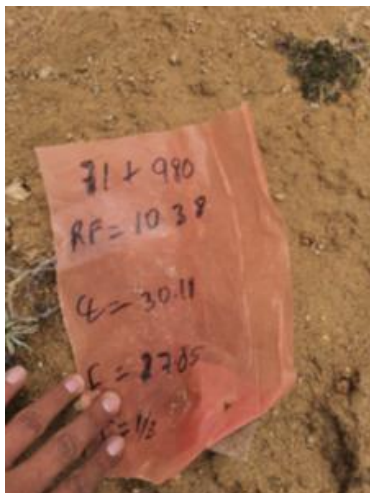


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+950
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+950, CON LA PARTICIPACION DE UN CAPATAZ, UN TRABAJADOR, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+820 AL KM 83+300
EVALUACIÓN EN GEOTECNIA DEL ESTADO DE TALUDES EN PREDOMINANCIA
DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ EN CAMPO LA EVALUACIÓN EN GEOTECNIA DEL ESTADO DE
TALUDES EN PREDOMINANCIA DE MATERIAL SUELTO CON LA PARTICIPACIÓN
DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA DE LA
CONTRATISTA CRBC Y DE LA SUPERVISIÓN EN EL TRAMO DE LA CARRETERA
DEL SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+820 AL KM 83+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-03-2021
