



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                           |                              |                                                                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra:<br>Si | Nro<br>Inform<br>e:<br>88 | Fecha Informe:<br>20-03-2021 | Nombre De La Obra:<br>Corredor vial Lima-Canta-<br>Huayllay-Dv. Cochamarca-<br>Emp. PE 3N Obras de<br>Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado:<br>M A N U E L J A V I E R<br>FLORENCIO RADO |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se realiza en sectores parciales del corredor vial.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

**8) INCIDENTES:**

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID – 19.

Se tuvo una reunión en campo con un ingeniero representante de la minera VOLCAN, en la cual participaron el Especialista en Seguridad de la Supervisión, Especialistas de Geología y Geotecnia tanto de la Supervisión y Contratista.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**

20-03-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-03-2021

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER  
FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-03-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA  
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE REALIZÓ LA INSPECCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUPERVISOR REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS DE LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-03-2021

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER  
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-03-2021

## Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA CONTRATISTA DE OBRA  
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU

## CDescripción\_\_\_\_\_:

SE REALIZÓ LA INSPECCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA LOS TRABAJOS DE LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA Y PROVENIENTES DE LA CANTERA DEL KM 37+100 Y DEL KM 37+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-03-2021

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-03-2021


**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID -19 DE LA SUPERVISION DE OBRA  
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID -19 DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR, DONDE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS SANITARIOS COMO DESINFECCION DE ROPA Y CALZADO, LAVADO Y SECADO DE MANOS, MEDICION Y CONTROL DE LA TEMPERATURA Y PULSO DEL PERSONAL.

**Foto1:**

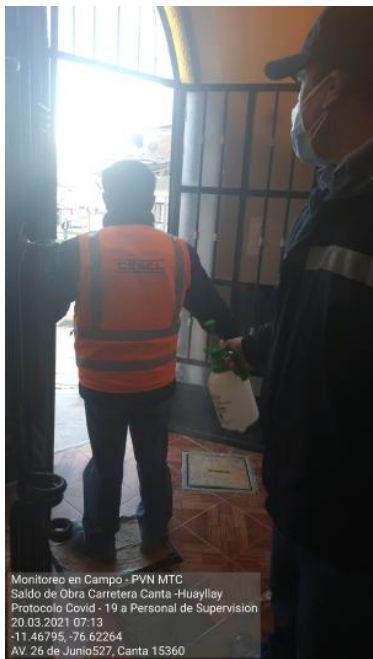

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-03-2021
