

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 97	Fecha Informe: 31-03-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a las solicitudes de adicionales de obra presentados por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y señalización de segregación de residuos sólidos.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realiza en sectores parciales del corredor vial. Al respecto se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha solicitado a la contratista atender mayores sectores con Mantenimiento y Colocación de Señalización para el tránsito vehicular en el periodo de lluvias, la demora por parte del contratista para atender lo indicado por la Supervisión está siendo cuantificada para la aplicación de penalidades.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados, principalmente no se cuenta con la Aprobación del reemplazo del Ingeniero Responsable de Topografía.

8) INCIDENTES:

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Hidrología, Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.



Auditoria Fecha De Creación:
31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:
01-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO	No Aplica	31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 9+060
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 9+060 CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, UNA RETROEXCAVADORA, CAMION VOLQUETE CON SUS OPERADORES.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740 CON DIEZ TRABAJADORES, DOS VIGIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

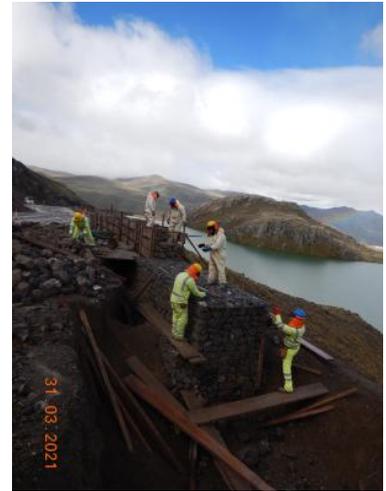

Fecha Toma De Datos:

31-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+400
MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA REUNION EN CAMPO CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL MURO DE
CONCRETO ARMADO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+400.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+360
MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 57+360, CON LA PARTICIPACION DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO, UNA EXCAVADORA Y CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES Y UN TRABAJADOR.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945
REUNION CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA REUNION EN CAMPO CON REPRESENTANTES DE SEDAPAL RESPECTO A LA EVALUACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377 CON CINCO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 71+990
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA DEL SECTOR DEL KM 71+990 CON UN RESPONSABLE, UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR, DOS VIGIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+140
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 72+140, CON LA PARTICIPACION DE DOS TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y UN RODILLO BERMERO CON SU OPERADOR.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+600
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA DEL SECTOR DEL KM 77+600 CON UN RESPONSABLE, DOS TRABAJADORES, DOS EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS Y UN TRACTOR SOBRE ORUGAS CON SUS OPERADORES.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-03-2021
