



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:
Si

Nro
Inform
e:
4 9 -
2021

Fecha Informe:
17-04-2021

Nombre De La Obra:
CARRETERA CALEMAR -
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio
Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 914 DEL CONTRATISTA (15/04/2021)

ASIENTO N°914: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: EVALUACION GEOLOGICA TALUD DE CORTE ADICIONAL N°02, KM 4+100 AL KM 4+400.

Se han producido varios deslizamientos de material de talud de corte en el tramo adicional N° 02 entre las progresivas 4+100 al 4+400.

Es importante que se realice una evaluación geológica del sector mencionado, para previo análisis, adoptar una solución tratando de lograr la estabilidad del talud del sector citado.

Agradeceremos nos indique la solución definitiva para el proceso.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•Si cumple.



b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Cierran el pase a la altura del kilometro 2+000, por mantenimiento vial.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con la construcción de obras de arte en el tramo.

Auditoria Fecha De Creación:

17-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E ($F'C=175 \text{ KG/CM}^2$);
PROGRESIVA 7+200.

CDescripcion _____:

01 TROMPO MEZCLADOR;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
01 RETROEXCAVADORA;
01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
06 AYUDANTES.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

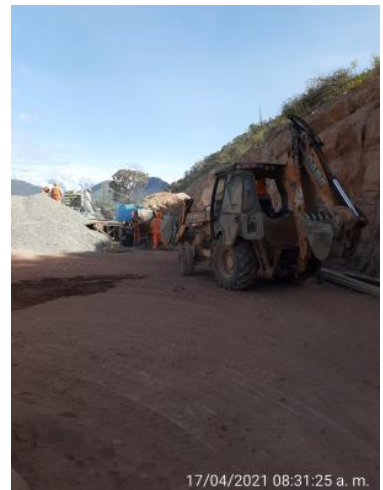

Fecha Toma De Datos:

17-04-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 29+130.

CDescripcion_____:

01 RETROEXCAVADORA;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;
01 VIGIA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-04-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2021

Actividades:700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 2+435;**CDescripcion_____:**14 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

17-04-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

