




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	82	07-05-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°82-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA:

• El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta Asiento N°585 (del Supervisor), con fecha 03/05/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.

2) MAYORES METRADOS:

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0390 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de Monitoreo Ambiental

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.

3) DEDUCTIVOS:

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.

4) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

• Con OFICIO N° 930-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite a la supervisión la Opinión técnica del Levantamiento de Observaciones del Plan de Seguridad Ocupacional en el Trabajo del Consorcio ICC para el año 2021, encontrándole observada.

5) MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.

6) ADICIONALES DE OBRAS:

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0404 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad el Sustento Necesidad de Prestación Adicional de Obra.

7) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• Con CARTA N°046-2021/ICC de fecha 05.05.2021, el contratista remite a la entidad la Aclaración de Entidad por Discrepancia interna respecto a procedencia de uso de DMEs 11 y 29 y Ampliaciones de los DMEs 08 y 24, para la formulación de prestaciones Adicionales.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el Especialista de Suelos y Pavimentos desde el 03.05.2021 hasta el 09.05.2021.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.

Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto directo con un contagiado de Covid-19. el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario mencionar que, Con OFICIO N° 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite el Cambio de Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión el Ing. Henry Lincol Porta Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza.

Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.

A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para realizar las medias del Slump en obra y prensa Hidráulica en laboratorio.

9) INCIDENTES:

-A la fecha no se registran incidentes.

10) PACRI:

-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Taucá.

11) ARQUEOLOGÍA:

-Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.



12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
- Relleno y compactado, alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el km 25+300. densidad de campo método cono de arena.
- Relleno y compactado, alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el km 25+653.58.
- Excavación para alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el km 16+238.59; densidad de campo método cono de arena.
- Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
- Corte en el km 3+370.
- Corte y carguío en el km 4+150.
- Corte y carguío en el km 4+500.
- Corte y carguío en el km 8+140.
- Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
- Extracción y apilado de material para sub base y relleno en la cantera llapo ubicado en el -0.63 km.
- Con OFICIO N° 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite el Cambio de Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión el Ing. Henry Lincol Porta Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza.
- Con OFICIO N° 930-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite a la supervisión la Opinión técnica del Levantamiento de Observaciones del Plan de Seguridad Ocupacional en el Trabajo del Consorcio ICC para el año 2021, encontrándole observada.
- Con CARTA N° 2510019-CG-21-0402 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad la Valorización de Obra N° 02 – Adicional N° 01 correspondiente al mes de abril 2021.
- Con CARTA N° 2510019-CG-21-0403 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad la Valorización de Obra N° 14 Correspondiente al mes Abril 2021.
- Con CARTA N° 2510019-CG-21-0404 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad el Sustento Necesidad de Prestación Adicional de Obra.
- Con CARTA N° 359-COONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 07.05.2021, el contratista remite a la supervisión la Presentación del Plan de Trabajo del mes de mayo 2021.
- Con CARTA N° 360-COONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 07.05.2021, el contratista remite a la supervisión la Propuesta de solución al déficit de arena para concreto hidráulico en obra: Combinación 70% ANZL- 30%ACHZL



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.
- Se recomienda al contratista “Consortio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
- Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

07-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

-TRIAJE A LOS COLABORADORES QUE SE ESTAN REINCORPORANDO.

CDescripcion_____:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.

ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE.

-SE ESTA TRASLADANDO MATERIAL BRUTO DEL ACOPIO PROVISIONAL DEL KM 2+000 PARA SER ZARANDEADO.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

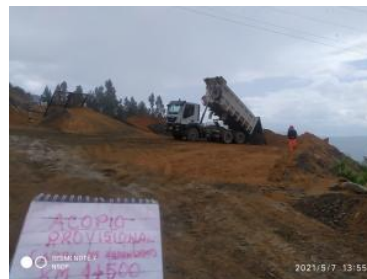

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 8+140.

CDescripcion_____:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO, ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM
25+300
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_____:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.

EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO, ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 25+653.58.

CDescripcion_____:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.

EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_____:

MO: 1 CONTROLADOR, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

6

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****07-05-2021****Actividades:****RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO, DE TAUCA KM 00+000 AL DME N°1
HUACHASPINA.****CDescripcion_____:****MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-05-2021**

7

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO, DE TAUCA KM 00+000 AL DME N°1
HUACHASPINA.**CDescripcion_____:**MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

07-05-2021

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO EN LA
CANTERA LLAPO UBICADO EN EL -0.63 KM.

CDescripcion_____:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 2+000

CDescripcion_____:

SE ESTA TRASLADANDO MATERIAL AL KM 1+500 PARA SER ZARANDEADO PARA
OBTENER MATERIALDE RELLENO Y OVER.

MO: 1 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE EN EL KM 3+370.

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 3+550.

CDescripcion_____:

- EN ESTE FRENTE SE ESTA REALIZANDO EN TURNO NOCHE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 9
OPERADORES, 2 VIGÍAS.EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

13



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 4+500

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

14



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 8+140.

CDescripcion_____:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 16+238.59

CDescripcion_____:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 OFICIAL, 3 PEONES, 2 VIGÍAS.

EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN LD PARA ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL 36 KM 16+420

CDescripcion_____:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.

EM: 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

07-05-2021

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_____:

18

MO: 1 CONTROLADOR, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

07-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:
