




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	080- NAC M - ESC -DO PVN	01-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 080-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 01 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 115+500 AL KM 119+500

Recomendaciones:


SE RECOMIENDA INCREMENTAR LA SEÑALIZACION EN TODO EL TRAMO II, PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES DE TRANSITO VEHICULAR.

Auditoria Fecha De Creación:

01-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-06-2021

Actividades:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 115+500 AL KM 116+500

PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO
VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 VOLQUETE, 01
VAN TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-06-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 116+500 AL KM 117+500

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-06-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 117+500 AL KM 118+500

CDescripcion_____:

PERFILADO Y COMPACTADO DE VIA


Foto1:



Foto2:



Foto3:

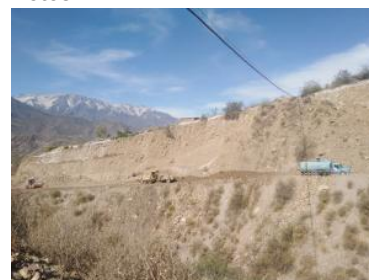

Fecha Toma De Datos:

01-06-2021



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-06-2021

Actividades:

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 118+500 AL KM 119+500

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE VIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-06-2021
