




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	081-NACM-ESC-DO PVN	02-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 081-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 02 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

TRABAJOS DE DESENCALAMINADO INICIAL QUE SE PRODUCE ENTRE LOS KM 120+000 AL KM 123+000

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 120+000 AL KM 121+000

MANTENIMIENTO DE VIA: SE DIO TRANSITABILIDAD

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION
VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01
MOTONIVELADORA, 01 VAN TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4
PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-06-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 120+000 AL KM 121+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

02-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:



02-06-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO DEL KM 121+000 AL KM 122+000

CDescripcion_____:

DESENCALAMINADO DE VIA

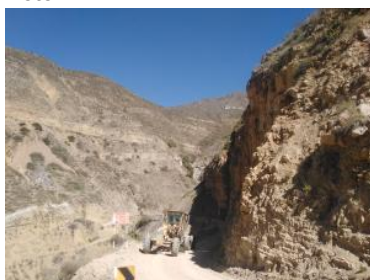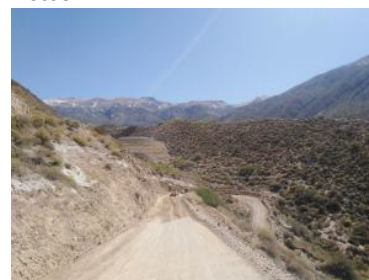Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

02-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 122+000 AL KM 123+000

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-06-2021

4
