




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	004-2021	26-06-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

El contratista cuenta con 3 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), 3 frentes de movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), además conformación de DME12 y DME 15.

Se inicio la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista. Durante ésta estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Recomendaciones:


Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación:

26-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****26-06-2021****Actividades:****Movimiento de tierra****CDescripcion_____:****Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 3+630 a DME en 7+100****1 Cargador sobre orugas****5 volquetes****01 Capataz****02 AYUDANTES****01 VIGIA.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****26-06-2021****1**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista (Frente 3+630)

CDescripcion_____:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista en el frente 3+630.

Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1:



Foto2:

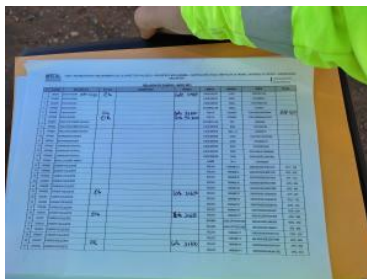


Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Conformación DME 12

CDescripcion_____:

Conformación DME 12 en progresiva 7+ 100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista

CDescripcion_____:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista en el frente del DME 12 7+100.

Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista en planta Chacomás 8+480

CDescripción_____:

Se realizó la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista en planta Chacomás 8+480.

Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de equipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

5

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****26-06-2021****Actividades:****Extracción y movilización de material de cantera Chacomás****CDescripcion_____:****Se realizan los trabajos de extracción y movilización de material de río la cantera chacomás ubicada en la progresiva 9+600****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****26-06-2021****6**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista en Taller cachicadan

CDescripcion_____:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista en en Taller cachicadan.

Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

movimiento tierras

CDescripcion_____:

corte eliminacion p 25 960
1 escaladora oruga
8 9 volquetes
ayudante
operario
traslado a dme 15 p 29 800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

8



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****26-06-2021****Actividades:****Movimiento de tierras****CDescripcion_____:****Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 26+600 a DME 15 en 29+800****Cargador sobre orugas****1 Excavadora****1 cargador frontal****7 volquetes****1 operario****1ayudante****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****26-06-2021**

9

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO**Nivel:**

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Conformación DME 15 29+800

CDescripcion_____:Se realizan los trabajos de conformación del DME 15 en la progresiva 29+800
2 Tractor de orugas**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021

10
