



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:
Si

Nro
Inform
e:
004

Fecha Informe:
07-07-2021

Nombre De La Obra:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 004, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°031 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°032 (SUPERVISOR DE OBRA)

2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA

-SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.

DEL SUPERVISOR:

-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE

3)INCIDENCIAS:

SE COMUNICA, QUE EL DÍA DE HOY MIERCOLES 07/07/21 A HORAS 11:30 AM SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL SECTOR DE TRABAJO PROGRESIVA KM 22+500, CON LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CONDE VILUYO, PROPIETARIOS DEL PREDIO UBICADO ENTRE LA PROG. KM 22+500 A KM 24+500, LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL REPRESENTANTE DEL PLAN PACRI-MTC Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA TRATAR LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS AUXILIARES PARA EL USO DE DME (BOTADERO), PATIO DE MAQUINAS Y OTROS.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA.

- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.


- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****07-07-2021****Actividades:****TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 26+000 A KM 27+000****CDescripcion_____:****MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 4 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-07-2021**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

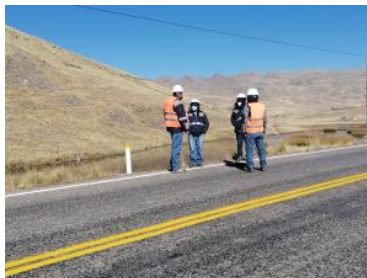Personal Encargado:**SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****07-07-2021****Actividades:****SEGURIDAD Y SALUD****CDescripcion_____:****EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
SUPERVISION DANDO INDICACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE
OBRA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-07-2021**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

REUNION DE LAS AUTORIDADES COMUNALES DE CONDE VILUYO CON EL
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PACRI

CDescripcion_____:

DIALOGO SOBRE LOS PREDIOS A AFECTARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
