



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                            |                              |                                                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra:<br>Si | Nro<br>Inform<br>e:<br>004 | Fecha Informe:<br>07-07-2021 | Nombre De La Obra:<br>REHABILITACION Y<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>CARRETERA: PATAHUASI -<br>YAURI - SICUANI TRAMO<br>COLPAHUAYCO-LANGUI | Personal Encargado:<br>SANDY DEISSY PRADO<br>ALLENDE |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

NÚMERO DE INFORME 004, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°031 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°032 (SUPERVISOR DE OBRA)

2)RECURSOS OFERTADOS  
DEL CONTRATISTA

-SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.

DEL SUPERVISOR:

-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE

3)INCIDENCIAS:

SE COMUNICA, QUE EL DÍA DE HOY MIERCOLES 07/07/21 A HORAS 11:30 AM SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL SECTOR DE TRABAJO PROGRESIVA KM 22+500, CON LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CONDE VILUYO, PROPIETARIOS DEL PREDIO UBICADO ENTRE LA PROG. KM 22+500 A KM 24+500, LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL REPRESENTANTE DEL PLAN PACRI-MTC Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA TRATAR LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS AUXILIARES PARA EL USO DE DME (BOTADERO), PATIO DE MAQUINAS Y OTROS.

#### Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA.

- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.


- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-07-2021




### PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:****SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****07-07-2021****Actividades:****TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 26+000 A KM 27+000****CDescripcion\_\_\_\_\_:****MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 4 PEONES  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-07-2021**

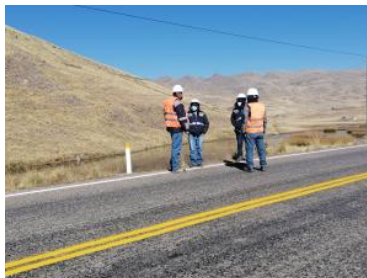**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****07-07-2021****Actividades:****SEGURIDAD Y SALUD****CDescripcion\_\_\_\_\_:****EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA  
SUPERVISION DANDO INDICACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE  
OBRA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-07-2021**

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

REUNION DE LAS AUTORIDADES COMUNALES DE CONDE VILUYO CON EL  
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PACRI

CDescripcion\_\_\_\_\_:

DIALOGO SOBRE LOS PREDIOS A AFECTARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
