



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                            |                              |                                                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra:<br>Si | Nro<br>Inform<br>e:<br>006 | Fecha Informe:<br>09-07-2021 | Nombre De La Obra:<br>REHABILITACION Y<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>CARRETERA: PATAHUASI -<br>YAURI - SICUANI TRAMO<br>COLPAHUAYCO-LANGUI | Personal Encargado:<br>SANDY DEISSY PRADO<br>ALLENDE |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

NÚMERO DE INFORME 006 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°035 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°036 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS  
DEL CONTRATISTA  
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.  
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE ELABORANDO DOCUMENTACION, AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.  
DEL SUPERVISOR:  
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.  
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR.
- 3)OTROS  
- ACTUALMENTE SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 2 CUADRILLAS, LOS CUALES SON SUPERVISADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.  
- EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL EL RESIDENTE DE OBRA COMUNICA AL SUPERVISOR DE OBRA A QUE PARTICIPE EN LA REUNION CONCERTADA CON LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA) SICUANI CON FINES DE TRAMITE PARA EL USO DE FUENTES DE AGUA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13/07/21.

#### Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA PARA LA CUADRILLA DE NIVELACION TENER PERSONAL VIGIA.
- SE RECOMIENDA AL PERSONAL TECNICO MEJORAR SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION MANTENER LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.



Auditoria Fecha De Creación:  
09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:  
10-07-2021

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-07-2021

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 28+000 AL KM 29+000

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES, 2 VIGIAS  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

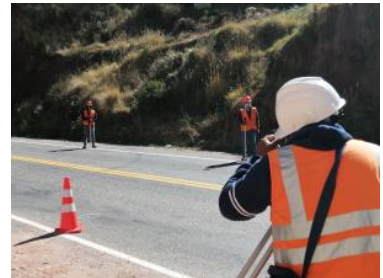

**Fecha Toma De Datos:**

09-07-2021

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 25+000 AL KM. 29+790

CDescripcion\_\_\_\_\_:

MO: 1 TOPOGRAFO , 2 PEONES  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE LA VIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion\_\_\_\_\_:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
