



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009	Fecha Informe: 13-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 009 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°041 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°042 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
 - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, AL ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- DEL SUPERVISOR:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
- 3)OTROS
 - SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 2 CUADRILLAS, LAS CUAL ES SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
 - EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE CONTEO VEHICULAR, PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.
 - SE REALIZO LA VISITA DEL REPRESENTANTE DEL ALA PARA LA VERIFICACION DE LAS FUENTES DE AGUA.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA MAYOR COORDINACION EN EL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

Auditoria Fecha De Creación:
13-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
14-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
CONTROL DE TEMPERATURA, PULSO Y NIVEL DE OXIGENO

CDescripcion_____:
 - SE OBSERVA AL ESPECIALISTA TOMANDO LA TEMPERATURA DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES.
 - SE MONITOREA EL PULSO Y EL NIVEL DE OXIGENO CON EL PULSIOXIMETRO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
REUNION CON PERSONAL DEL ALA

CDescripcion_____:
- REUNION Y VERIFICACION DE LAS FUENTES DE AGUA LAS CUALES ABASTECERAN LA OBRA
- FUENTES DE AGUA COLPAHUAYCO, CONDEVILUYO Y LANGUI.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-07-2021

Actividades:

ESTUDIO DE TRAFICO PROGRESIVA KM. 20+000

CDescripcion_____:

CONTEO VEHICULAR (SUPERVISION) MO:1 PERSONAL DE LA SUPERVISION


Foto1:



Foto2:



Foto3:

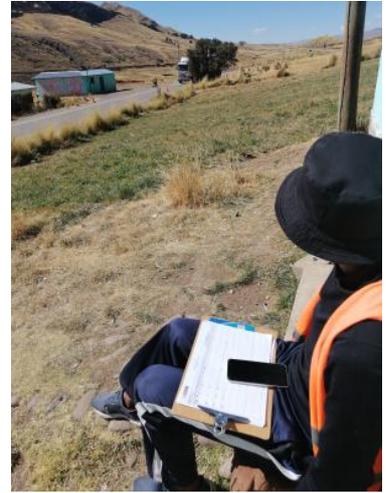

Fecha Toma De Datos:

13-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 19+900

CDescripcion_____:
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PESAJE VEHICULAR
PESAJE REALIZADO CON LA BASCULA PESA EJES
MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 21+000 AL KM 22+000

CDescripcion_____:
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES, 2 VIGIAS
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 23+000 AL KM. 25+000
PROGRESIVA KM. 28+000 AL KM. 29+000

CDescripcion _____:
MO: 1 TOPOGRAFO , 2 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE NIVELACION Y COMPROBACION DE PUNTOS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion _____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:

N & T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC
 ALQUILER DE CAMIONETAS 4x4, VAN'S, BUSES Y SERVICIOS GENERALES

HORA DE RUTA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

DIRIGIDA	13/07/2021 - 13/07/2021	FECHA	13/07/2021
ALQUILER	N&T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC		
USUARIO	CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4		
TIPO Y MODELO	MITSUBISHI L-200		
PLACA	YMR-870		
ANIO	2017		
CONDUCTOR	PECO LP		
CONDUCTOR	CÉSAR SARAGAYO CHILCO		
KILOMETRAJE DE PARTIDA	11878	KILOMETRAJE REGISTRO POR DATOS	11878
KILOMETRAJE FIN	11878		11878

EL CONDUCTOR OBEDECE CON LOS SEÑALES DE PROTECCION TRAFICO, Poner en Practica Personal, caso de emergencia, antes de ingresar, dentro del tiempo de trabajo, mantener la seguridad con el uso de cinturón de seguridad.

Control de kilometraje para obra monitoreo

INCIDENCIAS

FIRMA DEL CONDUCTOR: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
 FIRMA DEL AGENTE: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Foto3:

7

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2021
