



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 010	<b>Fecha Informe:</b> 14-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 010 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°043 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°044 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
  - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, AL ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO.
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- DEL SUPERVISOR:
  - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
- 3)OTROS
  - SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 1 CUADRILLA, LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
  - EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE CONTEO VEHICULAR, PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.
  - SE HIZO LA VERIFICACION DEL TRAMO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR
  - DE ACUERDO A LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL; DADA LAS NEGOCIACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA NO A AGOTADO TODO TIPO DE NEGOCIACION.



**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA COORDINACION EN EL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS CONTINUAR CON LA VERIFICACION DEL TRAMO ANTE LA POSIBILIDAD DE ENCUENTRO DE ZONAS CRITICAS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-07-2021

**Actividades:**

ESTUDIO DE TRAFICO  
PROGRESIVA KM. 19+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PESAJE VEHICULAR REALIZADAS CON LA BASCULA PESA EJES MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-07-2021

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 22+000 AL KM. 24+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MO: 1 TOPOGRAFO, 2PEONES,2 VIGIAS  
CIERRE DE POLIGONALES Y COMPROBACION DE PUNTOS.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-07-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-07-2021


**Actividades:**  
ESTUDIO DE TRAFICO  
PROGRESIVA KM. 28+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONTEO VEHICULAR (SUPERVISION)  
MO: 1 PERSONAL DE SUPERVISION

**Foto1:**



**Foto2:**

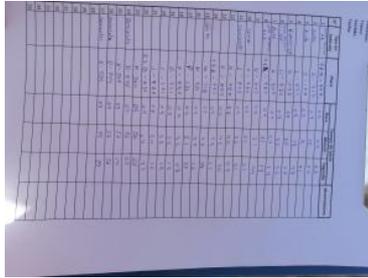

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-07-2021

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-07-2021

**Actividades:**

VERIFICACION DE TRAMOS DE OBRA  
PROGRESIVAS KM. 26+810, KM. 27+615, KM.26+324

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACION EN EL TRAMO DE LA OBRA POR LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS

PERSONAL TECNICO:

- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS SUPERVISION
- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTA
- JEFE DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-07-2021

