



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 014	<b>Fecha Informe:</b> 19-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**


**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 014 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°051 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°052 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO.

DEL SUPERVISOR:

-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.

-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

3) OTROS

- SE INICIO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS) EN EL TRAMO DE OBRA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.

-SE REALIZO LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE AIRE Y DEL RUIDO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANGANI A 150M DE LA CANTERA DE CHECTUYOC.

- EL CONTRATISTA REMITIO A SUPERVISION LA CARTA N° 039-2021-CVW CON EL ASUNTO: CONSTATAION POLICIAL - COMUNICACION PROPIETARIO TERRENO AREAS AUXILIARES.

4) INCIDENCIA

RESPECTO A LA CARTA N° 039 – 2021- CVW QUE EL CONTRATISTA PRESENTO A SUPERVISION CON EL ASUNTO CONSTATAION POLICIAL – COMUNICACIÓN PROPIETARIO TERRENO AREAS AUXILIARES , LA CUAL ANEXA LA CARTA 001-01-2021 DONDE SE MANIFIESTA EL SEÑOR CASIANO MAGAÑO LLACASI PROPIETARIO DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICAN LA AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL EL CUAL NO AUTORIZA EL INGRESO A SU PROPIEDAD , DE IGUAL MODO MANIFIESTA SI HUBIERA CUALQUIER POSIBLE ACUERDO SERIA BAJO SUS CONDICIONES Y QUE SOLO SE TRATARIA EXCLUSIVAMENTE CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

DE IGUAL MANERA SE ANEXA LA CONSTATAION POLICIAL DE LA PROPIEDAD DE CASIANO MAGAÑO LLACASI SOLICITADA POR EL ING. SEGUNDO ALCIDES CULQUI ORTIZ EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO VIAL WARI (RESIDENTE DE OBRA) DONDE SE COMPRUEBA QUE NO SE INGRESO AL TERRENO CON MAQUINARIA NI PERSONAL, ADEMÁS NO HAY INDICIOS DE INSTALACION DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL.

**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO, LA CUAL NO AFECTE A LA RUTA CRITICA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-07-2021

**Actividades:**  
CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CHARLA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO REALIZADA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN CAMPO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-07-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-07-2021

**Actividades:**  
CONTROL DE TEMPERATURA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
- SE OBSERVA AL ESPECIALISTA TOMANDO LA TEMPERATURA DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION Y CONTRATISTA ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-07-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 19+854, KM. 20+987, KM.20+707  
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PRIMERA CUADRILLA  
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2021

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 20+264, KM.20+403  
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SEGUNDA CUADRILLA  
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2021

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2021

**Actividades:**

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  
CENTRO POBLADO MARANGANI A 150M DE LA CANTERA CHECTUYOC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO  
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

5


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

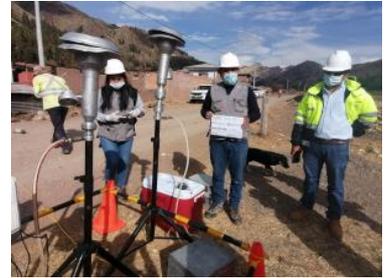

**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2021

**Actividades:**

MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO  
CENTRO POBLADO MARANGANI A 150M DE LA CANTERA CHECTUYOC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MO: 2 ESPECIALISTAS EN MONITOREO  
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-07-2021

**Actividades:**  
**CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA**

**CDescripcion:**  
**CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO**

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
**19-07-2021**

7
