



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 014	Fecha Informe: 19-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 014 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°051 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°052 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO.

DEL SUPERVISOR:

- SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

3) OTROS

- SE INICIO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS) EN EL TRAMO DE OBRA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.

- SE REALIZO LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE AIRE Y DEL RUIDO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANGANI A 150M DE LA CANTERA DE CHECTUYOC.

- EL CONTRATISTA REMITIO A SUPERVISION LA CARTA N° 039-2021-CVW CON EL ASUNTO: CONSTATAcion POLICIAL - COMUNICACION PROPIETARIO TERRENO AREAS AUXILIARES.

4) INCIDENCIA

RESPECTO A LA CARTA N° 039 – 2021- CVW QUE EL CONTRATISTA PRESENTO A SUPERVISION CON EL ASUNTO CONSTATAcion POLICIAL – COMUNICACION PROPIETARIO TERRENO AREAS AUXILIARES , LA CUAL ANEXA LA CARTA 001-01-2021 DONDE SE MANIFIESTA EL SEÑOR CASIANO MAGAÑO LLACASI PROPIETARIO DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICAN LA AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL EL CUAL NO AUTORIZA EL INGRESO A SU PROPIEDAD , DE IGUAL MODO MANIFIESTA SI HUBIERA CUALQUIER POSIBLE ACUERDO SERIA BAJO SUS CONDICIONES Y QUE SOLO SE TRATARIA EXCLUSIVAMENTE CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

DE IGUAL MANERA SE ANEXA LA CONSTATAcion POLICIAL DE LA PROPIEDAD DE CASIANO MAGAÑO LLACASI SOLICITADA POR EL ING. SEGUNDO ALCIDES CULQUI ORTIZ EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO VIAL WARI (RESIDENTE DE OBRA) DONDE SE COMPRUEBA QUE NO SE INGRESO AL TERRENO CON MAQUINARIA NI PERSONAL, ADEMÁS NO HAY INDICIOS DE INSTALACION DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO, LA CUAL NO AFECTE A LA RUTA CRITICA.

Auditoría Fecha De Creación:

19-07-2021

Auditoría Fecha De Edición:

20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA

CDescripcion_____:

CHARLA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO REALIZADA
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN CAMPO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA

CDescripcion_____:

- SE OBSERVA AL ESPECIALISTA TOMANDO LA TEMPERATURA DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION Y CONTRATISTA ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****19-07-2021****Actividades:****TRAZO Y REPLANTEO****PROGRESIVA KM. 19+854, KM. 20+987, KM.20+707****LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)****CDescripcion_____:****PRIMERA CUADRILLA****MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****19-07-2021**



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 20+264, KM.20+403
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

CDescripcion_____:

SEGUNDA CUADRILLA
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
CENTRO POBLADO MARANGANI A 150M DE LA CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_____:

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO
CENTRO POBLADO MARANGANI A 150M DE LA CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_____:

MO: 2 ESPECIALISTAS EN MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

No Aplica

19-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:

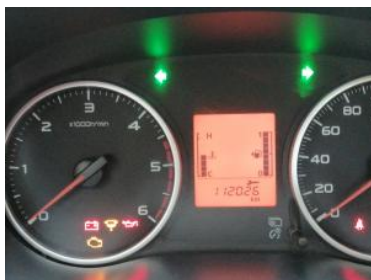


Foto2:

[illegible]

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-07-2021
