

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 017	Fecha Informe: 22-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 017 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°057 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°058 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, JEFE DE TOPOGRAFIA, 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.

- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

3) INCIDENCIAS.

- EL DIA DE HOY 22.07.2021 SE REANUDARON LAS ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA Y MONITOREO AMBIENTAL, DEBIDO A LA FINALIZACION DEL PARO DEL DIA 21.07.2021.

4) OTROS

• DE LA DOCUMENTACION:

- CON CARTA N° 027-2021-TEC4_RL/PVN DE FECHA 22.07.2021 LA SUPERVISION REMITE TANTO A LA ENTIDAD COMO AL CONTRATISTA LA NO CONFORMIDAD DE LA PETICION DEL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO PARA MATERIALES N°01.

- CON CARTA N° 015-2021-TEC4_JS/PVN LA SUPERVISION DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DEL EJE DEL PROYECTO QUE PRESENTO EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA N°043-2021-CVW, LA CUAL OBSERVO.

• ACCIONES DEL CONTRATISTA:

- EL CONTRATISTA PIENSA SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO DE ACUERDO AL ARTICULO 198. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO AL PARO DEL DIA 21.07. 2021. LA CUAL ES UNA CAUSAL NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- EL SUPERVISOR EN RESPUESTA DE LA CAUSAL INVOCADA PARA LA AMPLIACION DE PLAZO SEGUN EL ART. 198 DEL RLCE, PIDE AL CONTRATISTA JUSTIFICAR Y ACREDITAR CON TODOS LOS DOCUMENTOS REFERIDOS AL EVENTO SOCIAL QUE SE HA SUSCITADO EN LA ZONA (PARO REGIONAL).

- EL EQUIPO TECNICO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISION EXTRAE MUESTRAS DE LA CANTERA DE ROCA, PARA REALIZAR EN LABORATORIO LA PRUEBA DE ABRASION LOS ANGELES Y SEGUN LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES CORROBORRARA O DESESTIMARA LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.

- EL SUPERVISOR PIDE AL CONTRATISTA COMUNICAR CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISION VERIFIQUE LA ACTIVIDAD.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

22-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DEL AGUA
CANTERA CHECTUYOC AGUAS ABAJO

CDescripcion_____:
MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DE AGUA
CANTERA CHECTUYOC AGUAS ARRIBA

CDescripcion_____:
MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE EFECTUAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA
CANTERA DE CHECTUYOC

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
LAGUNA LANGUI

CDescripcion_____:
MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA LAGUNA LANGUI

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 22+588 AL KM. 24+575

CDescripcion_____:
MO: 2 TOPOGRAFOS, 4 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA, 2 VIGIAS.
SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO DE LA OBRA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
PROGRESIVA KM. 24+090
VILUYO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO

CDescripcion_____:

5

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE RELIZO EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 28+600
CERCA DE FIN DE TRAMO

CDescripcion_____:

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZO EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

6


Foto1:



Foto2:



Foto3:

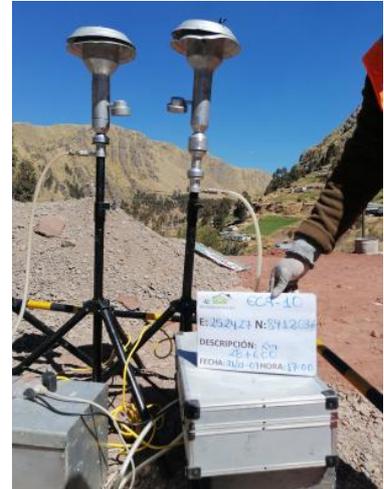

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DE RUIDO
PROGRESIVA KM. 28+600
CERCA DE FIN DE TRAMO

CDescripcion _____:
MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZO EL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE AGUA
PROGRESIVA KM. 29+780 AGUAS ABAJO
COLPAHUAYCO

CDescripcion_____:

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZO EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE AGUA
PROGRESIVA KM. 29+780 AGUAS ARRIBA
COLPAHUAYCO

CDescripcion_____:

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2021

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
Camioneta

CDescripcion _____:
Monitor

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:

CDescripcion _____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021
